

Protokol o změně díla

Změnový list č. 30

Předmět díla	Oprava objektu Nádraží 4, Brno		
Objekt	Nádraží 4, Brno		
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel	STRABAG a.s. Keřtářova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI	[redacted]		
Projektant	[redacted]		
Popis změny: Při vybavení stávajících zábrudí u všech vstupních byt dveří byly demontovány stávající lepené prahy. Prahy byly k podlaze lepeny a nebylo možné je bez poškození demontovat. V tomto stavu není možné tyto prahy použít na zpětnou montáž. Budou instalovány nové dřevěné prahy. Před montáží se upraví pro různou výšku podlahy. Toto bude provedeno v celém domě, vč. nástřru.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
	dokumentace skut. provedení	X	
	jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	30 356,64 Kč	0,04%
	Výše DPH sazba: 15%	4 553,50 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	34 910,14 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-29 (bez DPH)	950 169,51 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 565 592,90 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	85 750 431,84 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	30 356,64 Kč	0,04%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	30 356,64 Kč	0,04%
Termín	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce)	14.2.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)	14.2.2022	
	TDI, Ing.	14.2.2022	
	Projektant	14.2.2022	
	Objednatel (stat. zástupce)		
Přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.030 - Prahy pro T15s		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL030 Prahy pro T15s

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
15800 Praha-Jinonice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			30 356,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 356,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	30 356,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 30 356,64 CZK

v BRNO

dne 1.4.2022

[REDACTED]
Z

[REDACTED]
Za

942

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			30 356,64	100
Cena celkem					30 356,64	100

Položkový rozpočet

S:	STL1807301	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:		Změnové listy
R:		ZL030 Prahy pro T15s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				30 356,64
1	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	53,00000	44,37	2 351,61
2	766667931R00	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus	53,00000	130,05	6 892,65
		uprava prahu pro různou výšku podlahy hoblováním nebo vložením segmentu - 53		53,00000		
3	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	53,00000	116,88	6 194,64
4	763651103R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků	m2	9,06300	336,18	3 046,80
		53*0.9*(0.15+0.02+0.02)		9.06300		
5	61187181R	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	53,00000	223,96	11 870,94
Celkem						30 356,64

Protokol o změně díla

Změnový list č. 31

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: S ohledem na požadavek investora bylo každé stoupací potrubí doplněno samostatným uzávěrem pro možnost uzavření v případě havárie.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	☒	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	72 098,73 Kč	0,10%
	Výše DPH sazba: 15%	10 814,81 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	82 913,54 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-30 (bez DPH)	980 526,15 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 637 691,63 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	85 833 345,37 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	72 098,73 Kč	0,10%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	72 098,73 Kč	0,10%
termín	Termín realizace změny:	12/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	1.4.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	1.4.2022	
	TDI:	1.4.2022	
	Proje:	1.4.2022	
	Objednatel (stat. zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.031 - Doplnění uzavíracích ventilů na sluačky ZTI		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL031_Doplnění uzavíracích ventilů na stupačky ZTI

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
15800 Praha-Jinonice

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			72 098,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			72 098,73

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	72 098,73 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		72 098,73 CZK

v BRNĚ dne 1. 4. 2022

[REDACTED]

[REDACTED]

[Handwritten signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			72 098,73	100
Cena celkem					72 098,73	100

Položkový rozpočet

S:	STL1807301	OPRAVA OBJEKTU NADRAŽNÍ 4
O:		Změnové listy
R:		ZL031 Doplnění uzavíracích ventilů na stupačky ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				72 098,73
1	722172962R00	Vsaz odboč do plast potrubí polyf D 20 mm, vodovod	kus	14,00000	124,95	1 749,30
		14 ks stupaček od 2NP - cirkulace 14		14,00000		
2	722172965R00	Vsaz odboč do plast potrubí polyf D 40 mm, vodovod	kus	28,00000	221,00	6 188,00
		14 ks stupaček ve 2NP, tepla 14ks+studená14ks 28		28,00000		
3	722223131R00	Kohout vod kul vyp. komplet GIACOMINI R608 DN 15	kus	42,00000	232,08	9 746,10
4	722235121R00	Kohout vod kul vnitřní-vnitřní z. IVAR KK 51 DN 15	kus	14,00000	345,95	4 843,30
		dodatečné vsazení do potrubí				
5	722235124R00	Kohout vod kul vnitřní-vnitřní z. IVAR KK 51 DN 32	kus	28,00000	1 152,60	32 272,80
		dodatečné vsazení do potrubí				
6	723190907R00	Odvzdušnění a vypuštění a napuštění potrubí	m	630,00000	27,37	17 243,10
		14stupaček*5podlaží*3(výška podlaží*3(T+S+C) 14*5*3*3		630,00000		
7	898722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	1	0,04312	1 301,81	56,13
Celkem						72 098,73

Protokol o změně díla

Změnový list č. 32

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Jinonice 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Po vyklizení 2.PP a 1.PP byla zjištěna vyšší vlhkost zdiva v přízemních podlažích a na schodišti. Omítky jsou popraskané, vyduřené a v některých částech se drojí a odpadají. S ohledem na probíhající práce v přízemních prostorech je nutné provést sanaci zdiva. Současná omítka bude očištěna, odsekána, spáry budou vyčištěny. Zapraví se ryhy po demontované elektroinstalaci, zazdí se otvor vzniklý po demontované el.rozvodné skříni. Sanační omítka bude nanášena ve vrstvách – podhoz, sanační jádro, štuková omítka. Dále byla zjištěna zvyšující se vlhkost zdiva v archivu matky místnost č. S1 17 (pod oknem). Sanace zdiva bude provedena stejným sanačním systémem jako v případě schodiště přízemních podlaží 2.PP a 1.PP. Sanaci zdiva bude zamazeno vzlínatosti vody a její pronikání do stavebních konstrukcí v uvedených částí.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		☒
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	66 682,18 Kč	0,09%
	Výše DPH sazba: 15%	10 002,33 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	76 684,51 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-31 (bez DPH)	1 052 624,88 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 704 373,81 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	85 910 029,88 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-652,34 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	67 334,52 Kč	0,09%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	66 682,18 Kč	0,09%
termín	Termín realizace změny:	1/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasili:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (stat.zástupce)	1.4.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedouc)	1.4.2022	
	TDI:	1.4.2022	
	Projekant:	1.4.2022	
	Objednatel (stat.zástupce)		
přílohy	Přílohy		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.032 - Sanace zdiva 1.PP/2.PP Výkres. část - výřez - Půdorys 1.PP, Půdorys 2.PP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL032_Sanace zdiva 1.PP/2.PP

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4,
15800 Praha 5 - Jinonice

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 396,62
PSV			1 285,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			66 682,18

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	66 682,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 66 682,18 CZK

v BRNĚ

dne

1.4.2022



[Handwritten signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zaklady a zvláštní zakládání	HSV			21 817,35	33
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			598,99	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 383,91	58
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 617,72	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 285,56	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 978,65	4
Cena celkem					66 682,18	100

Položkový rozpočet

S	STL1807301	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O		Změnové listy
R		ZL032_Sanace zdiva 1.PP/2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				21 817,35
1	289902111R00	Očištění nebo odsekání omítek stěn schodiště 1.PP/2.PP	m2	44,87320	486,20	21 817,35

Včetně

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár
- odstranění zbytků malty z líců zdiva ocelovým kartáčem
- strabání a smetení otlučené suti
- boční stěny : (1,43*3,35)*2
- hl. zadní stěna : 3,18*3,35
- "parapet" : 3,16*0,2
- horní část schodiště : (2,87*3,35)+(0,28*0,14)*2*9
- spodní část schodiště : (2,57*3,35)+(0,28*0,14)*2*8
- přisáhy : propojení se stávající omítkou : (0,15*3,35)*2
- S1.17 - 1.PP : 1,41*3,2

9,58100

10,58600

0,63200

9,79090

8,76630

1,00500

4,51200

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				598,99
2	310271520R00	Zazdivka otvorů z porobetonových tvarnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 - tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,12000	4 991,55	598,99
		0,6*1*0,2		0,12000		

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				38 383,91
3	610411129R00	Nástřik roztokem "Esco - Fluat"	m2	44,87320	80,50	3 612,29

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 44,87320

44,87320

4	612403380R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	15,96000	56,72	905,25
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

po demontáži elektroinstalace : 4,3+3,16+4,0+1,5+3,0

15,96000

5	612421231R12	Óprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravovaných plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	-4,51200	144,58	-652,34
		PO ROZVODECH PROFESÍ				
		S1.17 - 4,5120		-4,51200		

6	612434253R11	Omítkový sanační systém Profisan, 3vrst. vrstvy podhoz OS 401, jádro OS 401, štuk OS 402	m2	44,87320	769,25	34 518,71
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 44,87320		44,87320		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 617,72
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	-----------------

7	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	5,16000	113,36	584,94
		mazipatro : 3,16*1		3,16000		
		nad schodištěm a pod schody : 1*1*2		2,00000		

8	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	6,00000	172,13	1 032,78
		1 - 3*1		3,00000		
		2 - 3*1		3,00000		

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 285,56
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	-----------------

9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - 2 skříň	kg	27,70000	46,41	1 285,56
		RTS 21/II - 15%				
		0,6*1,0m skříň oceli : 27,7		27,70000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 978,65
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,16715	133,45	422,86
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	9,50144	92,84	882,11
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,16715	95,71	303,13

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku


13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,34293	6,68	423,13
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,16715	133,92	424,14
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,16715	14,93	47,29
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,85471	166,81	476,19

Celkem						66 682,18
---------------	--	--	--	--	--	------------------


Návrhář: O. Ben

Průbor 1. PP

Sanace želez

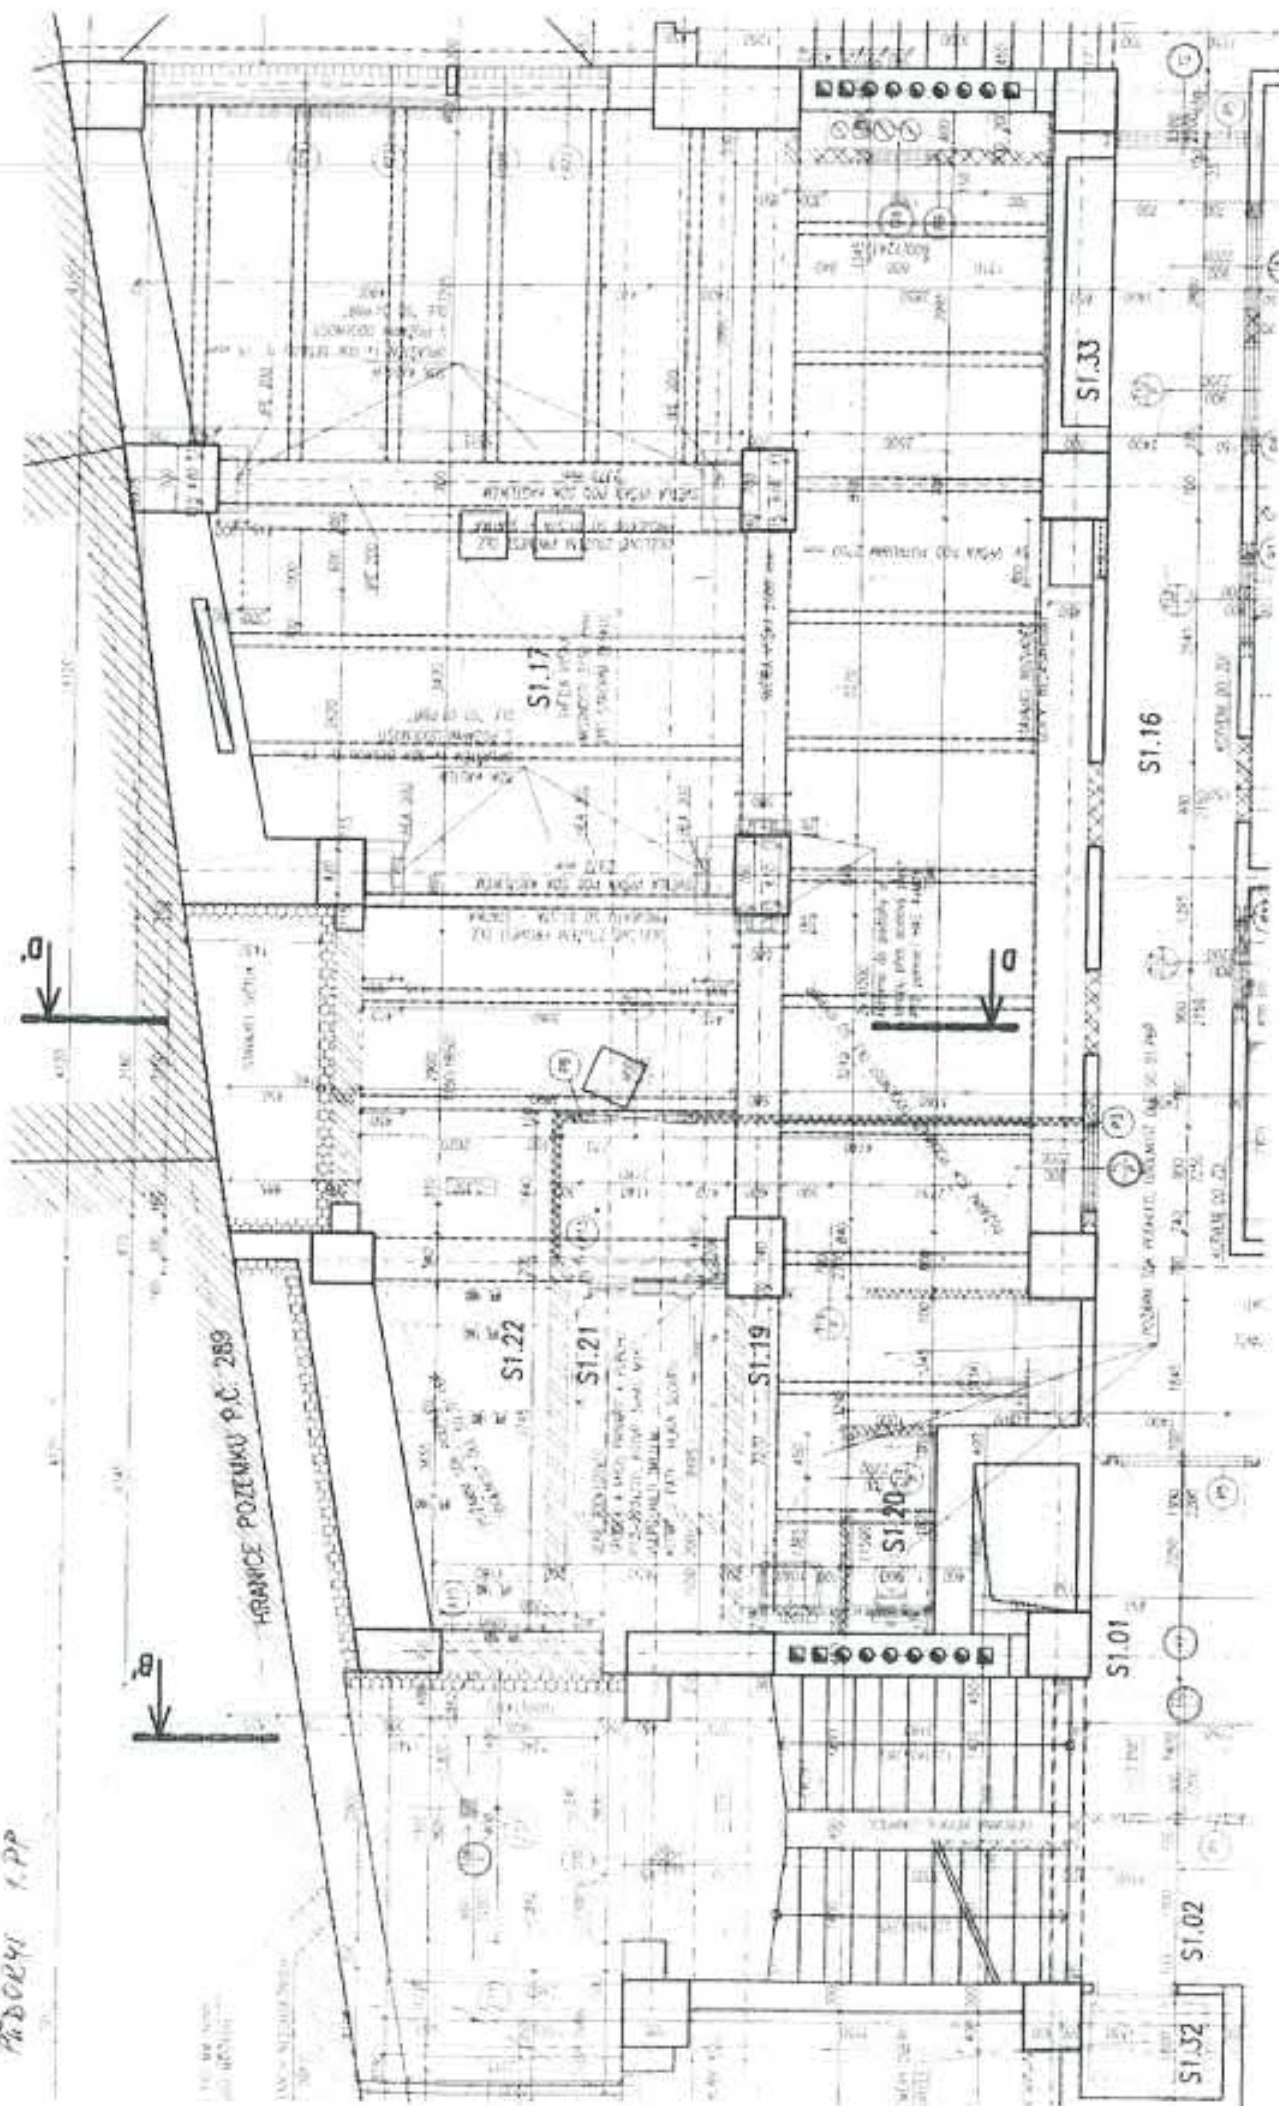

2009-2010

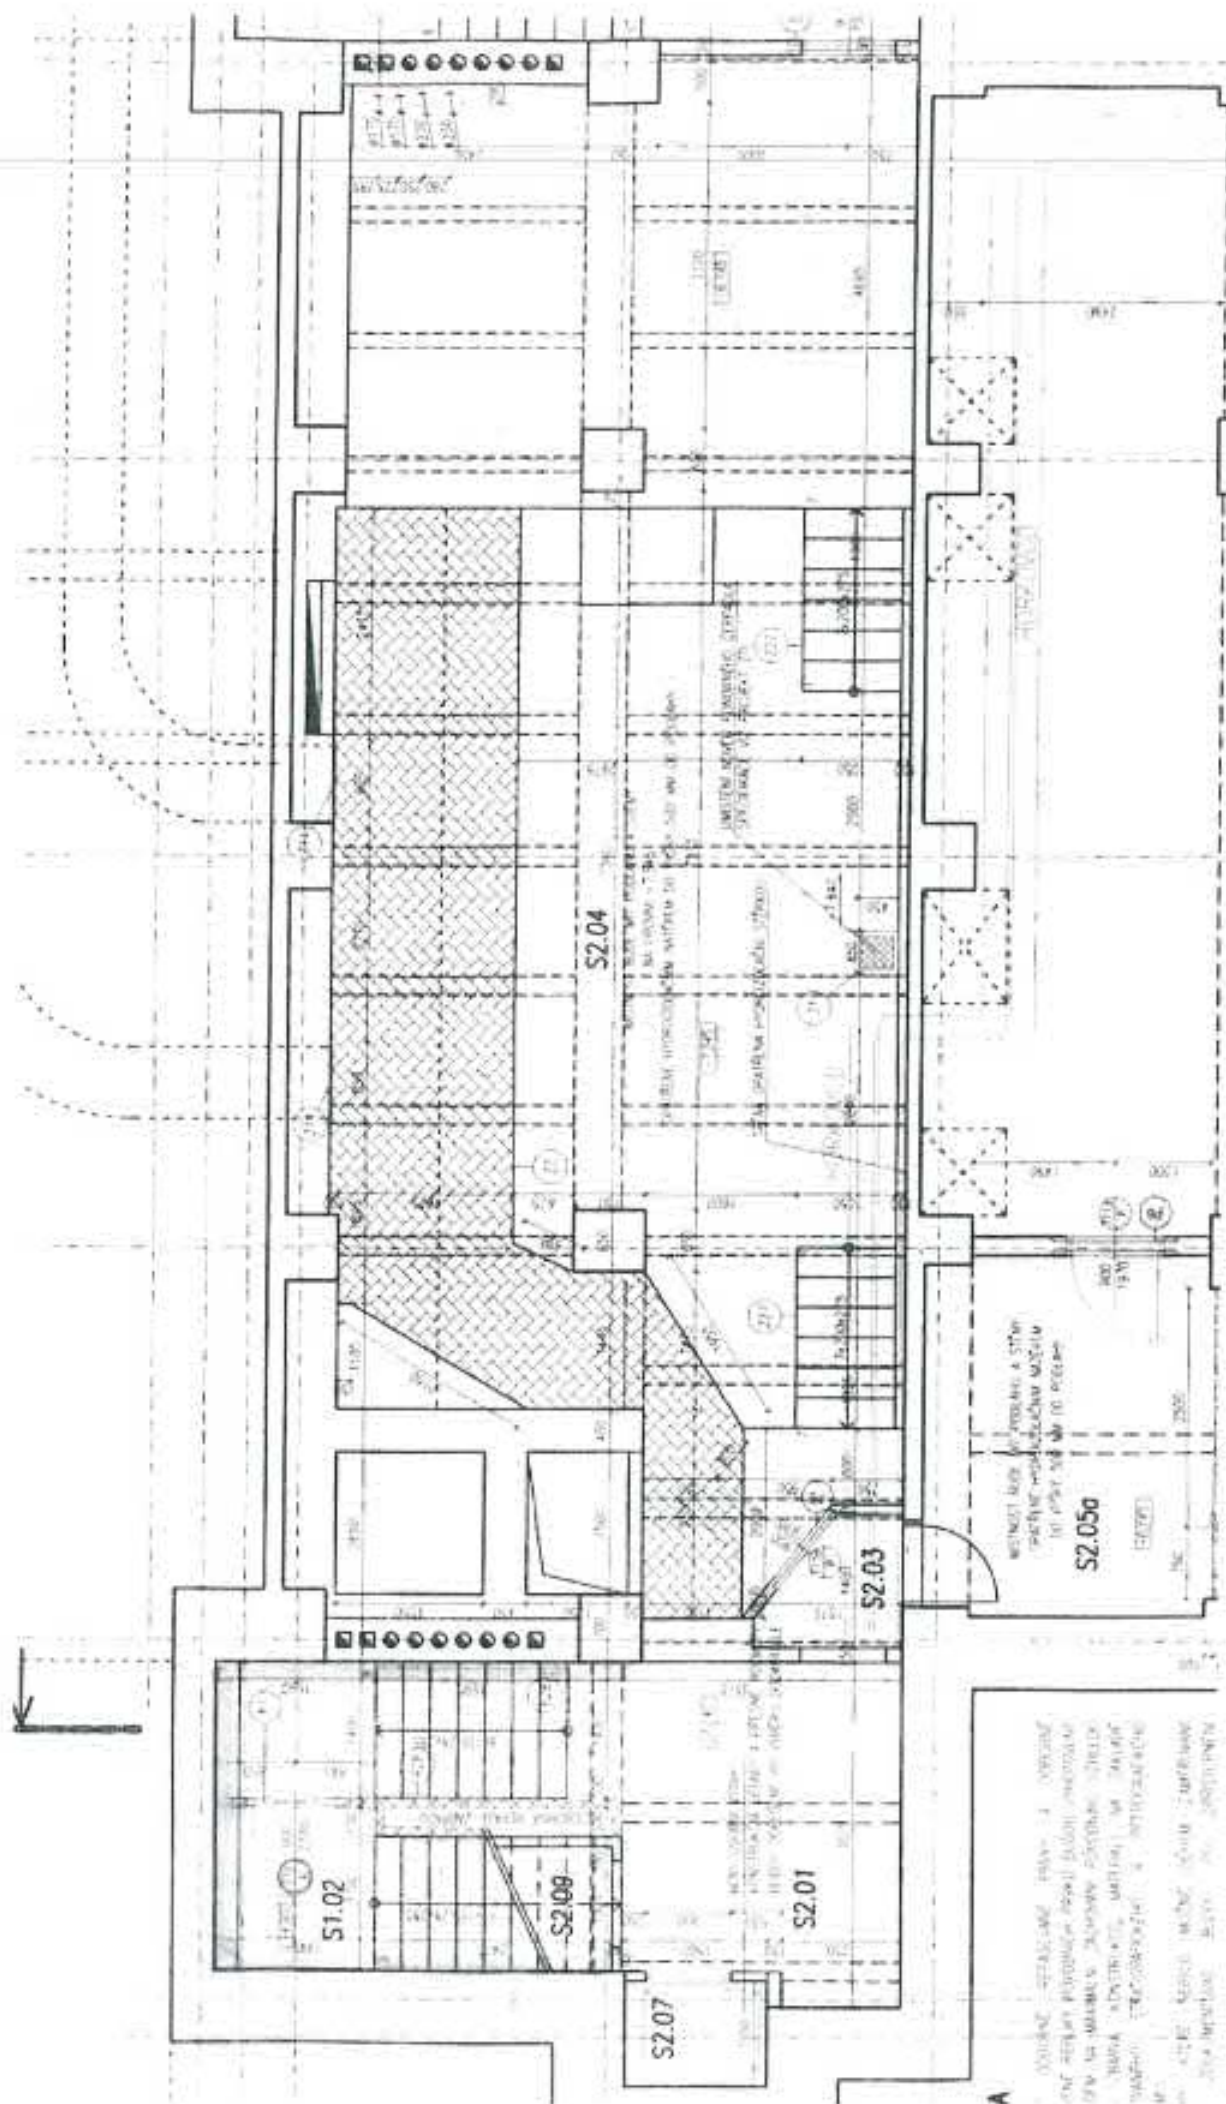

Protokol o změně díla

Změnový list č. 33

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:	Obklad fasády ze strany ul. Nádražní je proveden z přírodního kamene. Desky obkladu jsou dle PD repasovány. Jejich zpětná instalace vyžaduje větší pracovní prostor než při demontáži. Z tohoto důvodu je při spodní hraně fasády rozebrána a následně složena mozaika z dlažebních kostek. Pokud by se umístili desky na fasádu bez rozebrání mozaiky, bylo by pravděpodobné, že dojde k porušení hran desek z přírodního kamene a také by případně výsledný vzhled nebyl dle očekávání investora, usazením desek (příp. jejich zkrácením) by vznikla větší mezera mezi chodníkem a obkladem. Fasádní obklad tak bude dosedat hranou na stávající chodník a vizuálně bude vše působit jednotně.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	
		dokumentace skutku provedení	☒
		jiné	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	24 351,50 Kč	0,03%
	Výše DPH sazba: 15%	3 652,73 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	28 004,23 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-32 (bez DPH)	1 119 307,06 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 728 725,31 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	85 938 034,11 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	24 351,50 Kč	0,03%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	24 351,50 Kč	0,03%
termín	Termín realizace změny:	12/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (stat. zástupce)	1.4.2022	[REDACTED]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)	1.4.2022	[REDACTED]
	TDI:	1.4.2022	[REDACTED]
	Proj.	1.4.2022	[REDACTED]
	Objednatel (stat. zástupce)		[REDACTED]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.033		
	Výkresová část - Půdorys 1.NP		

Cenová nabídka

Stavba: **STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**
 Objekt: **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL033_Rozebrání a složení mozaiky pod repasovaným kamen.obkladem**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírkova 982/4, DIČ: **CZ60838744**
15800 Praha 5 - Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			22 628,65
PSV			0,00
MON			1 722,85
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 351,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	24 351,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH 24 351,50 CZK

v BRNO

dne 1. 4. 2022

_____ Za _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 157,94	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			644,48	3
5	Komunikace	HSV			12 553,20	52
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 239,85	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 137,46	17
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 722,85	7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 895,72	8
Cena celkem					24 351,50	100


Položkový rozpočet

S:	STL1807301	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:		Změnové listy
R:		ZL033_Rozebrání a složení mozaiky pod repasovaným kamen obkladem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 157,94
1	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky	m2	20,83000	55,59	1 157,94
		levá strana : 11,62		11,62000		
		pravá strana : 9,21		9,21000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				644,48
2	451459777R00	Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm	m2	20,83000	30,94	644,48
		Odkaz na min. položky pořadí 3 : 20,83000		20,83000		
Díl: 5		Komunikace				12 553,20
3	596141111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože MC do 4 cm	m2	20,83000	602,65	12 553,20
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 20,83000		20,83000		
Díl: 96		Bourání konstrukci				2 239,85
4	979071131R00	Očistění vybouraných kostek mozaikových, kam. láž.	m2	20,83000	107,53	2 239,85
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 20,83000		20,83000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 137,46
5	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	5,46892	756,54	4 137,46
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 722,85
6	460620031R00	Vyčištění šterkového lože	m2	20,83000	82,71	1 722,85
		srovnání stávajícího lože pro nový podklad				
		Odkaz na min. položky pořadí 1 : 20,83000		20,83000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 895,72
7	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,45794	133,45	328,01
8	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,45794	92,84	228,20
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,45794	95,71	235,25
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,15680	6,68	328,38
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,45794	133,92	329,17
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,45794	14,93	36,70
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,45794	166,81	410,01
Celkem						24 351,50

NADEBNÝ PLOCH
1. NP

ROZEBRANÝ A NOVÝ ZAPOJENÝ PLOCH
SOUSLEDNÝ OCEKTY

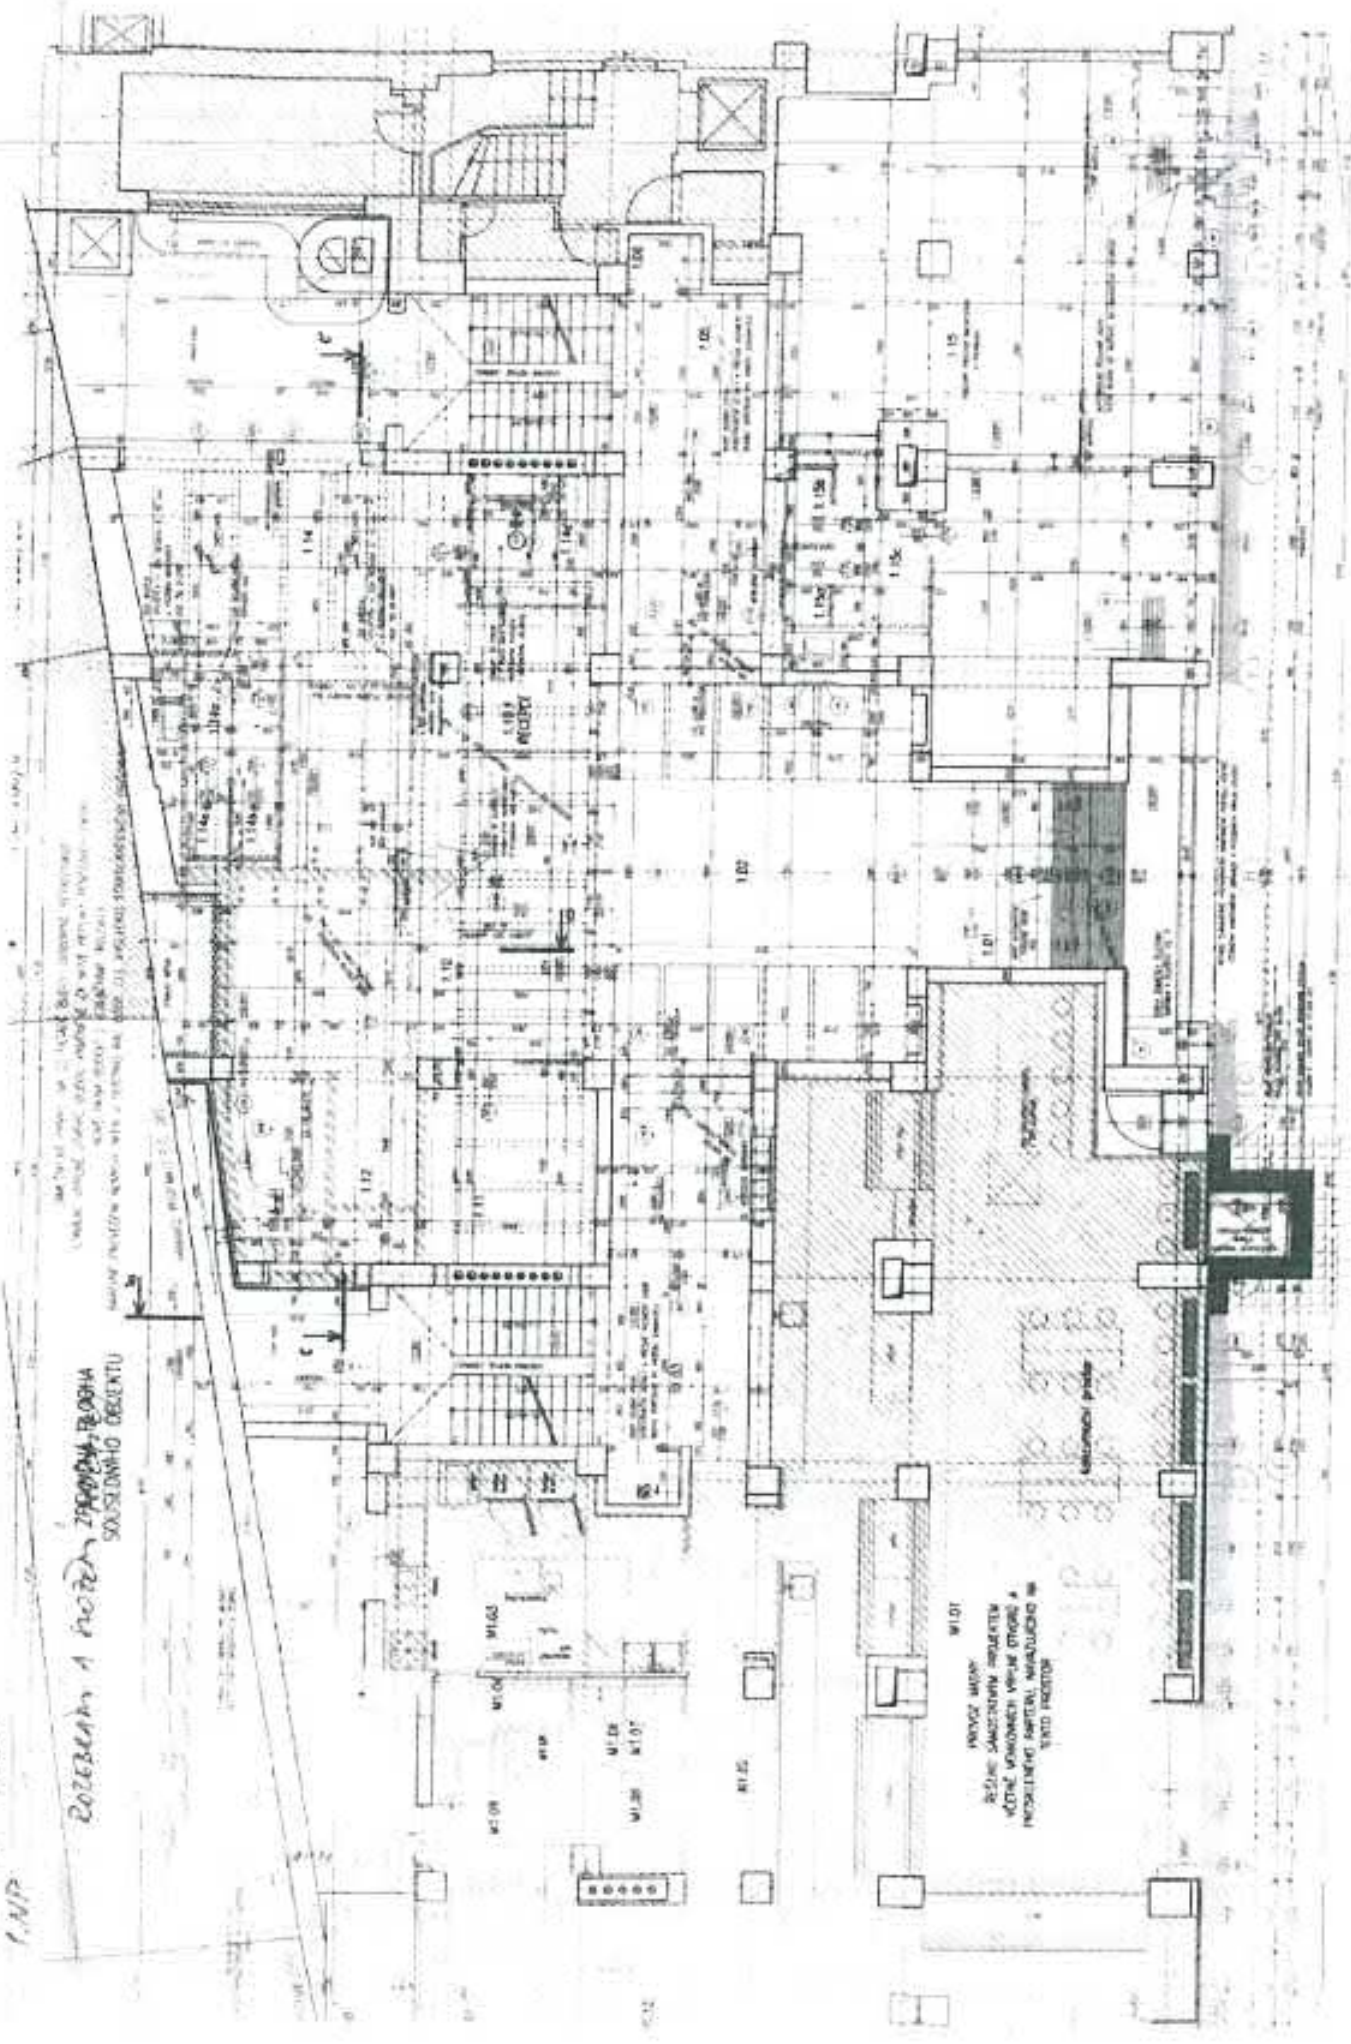

PROSTOR MIMO
KOTLE SAMOSTATNÝH
KOTLE MIMOCHY VÝHRE OTOPENÍ
PROSTOR MIMO MIMOCHY
VÝHRE OTOPENÍ

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

PROSTOR MIMO

Protokol o změně díla

Změnový list č. 34

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Během realizace výstavby bylo dohodnuto, že se jeden standard	Bylo		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	X
		jiné	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový pokles za dodatek č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	26 604,21 Kč	0,04%
	Výše DPH sazba: 15%	3 990,63 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	30 594,84 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-33 (bez DPH)	1 143 658,56 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 755 329,52 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	85 968 628,95 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-14 177,00 Kč	-0,02%
	Vícepráce celkem bez DPH	40 781,21 Kč	0,06%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	26 604,21 Kč	0,04%
termín	Termín realizace změny:	03.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	1.4.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	1.4.2022	
	TDI:	1.4.2022	
	Proj.:	1.4.2022	
	Objednatel (stat. zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.034 - Invalidní WC a umyvadlo		
	Výkresová část - Půdorys 2.NP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL034 Invalidní WC a umývadlo

Objednatel: Statutární město Brno IČO 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
 15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			26 604,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			26 604,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	26 604,21 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 26 604,21 CZK

v BRNĚ dne 1.4.2022

Za ob

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zahřívací předměty	PSV			26 604,21	100
Cena celkem					26 604,21	100

Položkový rozpočet

S:	STL1807301	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:		Změnové listy
R:	ZL034	Invalidní WC a umývadlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				26 604,21
1	725119110R00	Montáž splachovací zařízení pro WC, oddálené splachování	kus	1,00000	847,45	847,45
2	725017153R00	Umývadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	1 624,00	1 624,00
3	725291138R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 852 mm	soubor	4,00000	1 660,05	6 640,20
		WC 2ks : 2		2,00000		
		Umývadlo 2ks : 2		2,00000		
4	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Novaservis TP	soubor	1,00000	1 333,00	1 333,00
5	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	1,00000	202,30	202,30
6	725850102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	1,00000	137,28	137,28
7	725860216R00	Připojovací souprava HL134 1C, 5/4 "	kus	1,00000	1 182,35	1 182,35
8	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach umyvadlových D 32	kus	1,00000	144,50	144,50
9	726211332R00	Modul-WC Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00000	12 700,00	12 700,00
10	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	1,00000	967,30	967,30
11	28696714R	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu FRIAFIX F302	kus	1,00000	1 660,05	1 660,05
12	551070193R	MPO13 Oddálené pneumatické splachování	kus	1,00000	2 261,00	2 261,00
13	55145030R	Baterie umyvadlová směš. stojánková s ovl. odp. TM21	kus	1,00000	1 797,75	1 797,75
14	551621453R	HL15U-6/4 Odpadní ventil 6/4" s přepadem a zátkou, s připojovacím závěsem 6/4"	kus	1,00000	398,22	398,22
15	615290098R	Zrcadlo na desce MIO 64x57 cm, otočné, bílé	kus	1,00000	4 287,00	4 287,00
16	64240056R	Misa klozet. závěsná DEEP Handicap hluboké splach. bílá, 365x360x700 mm	kus	1,00000	4 568,75	4 568,75
17	Mimo RTS	Klozet závěsný	ks	-1,00000	9 666,98	-9 666,98
18	Mimo RTS	Umývadlo	ks	-1,00000	4 510,02	-4 510,02
19	996725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	l	0,04385	1 141,73	50,06
Celkem						26 604,21

Poznámky uchazeče k zadání


NABRAZNI 4, 2000

2.NP

PRICHA PLOBY

INVALIDNI WC H.C. 2/0

AKU P.C. 289

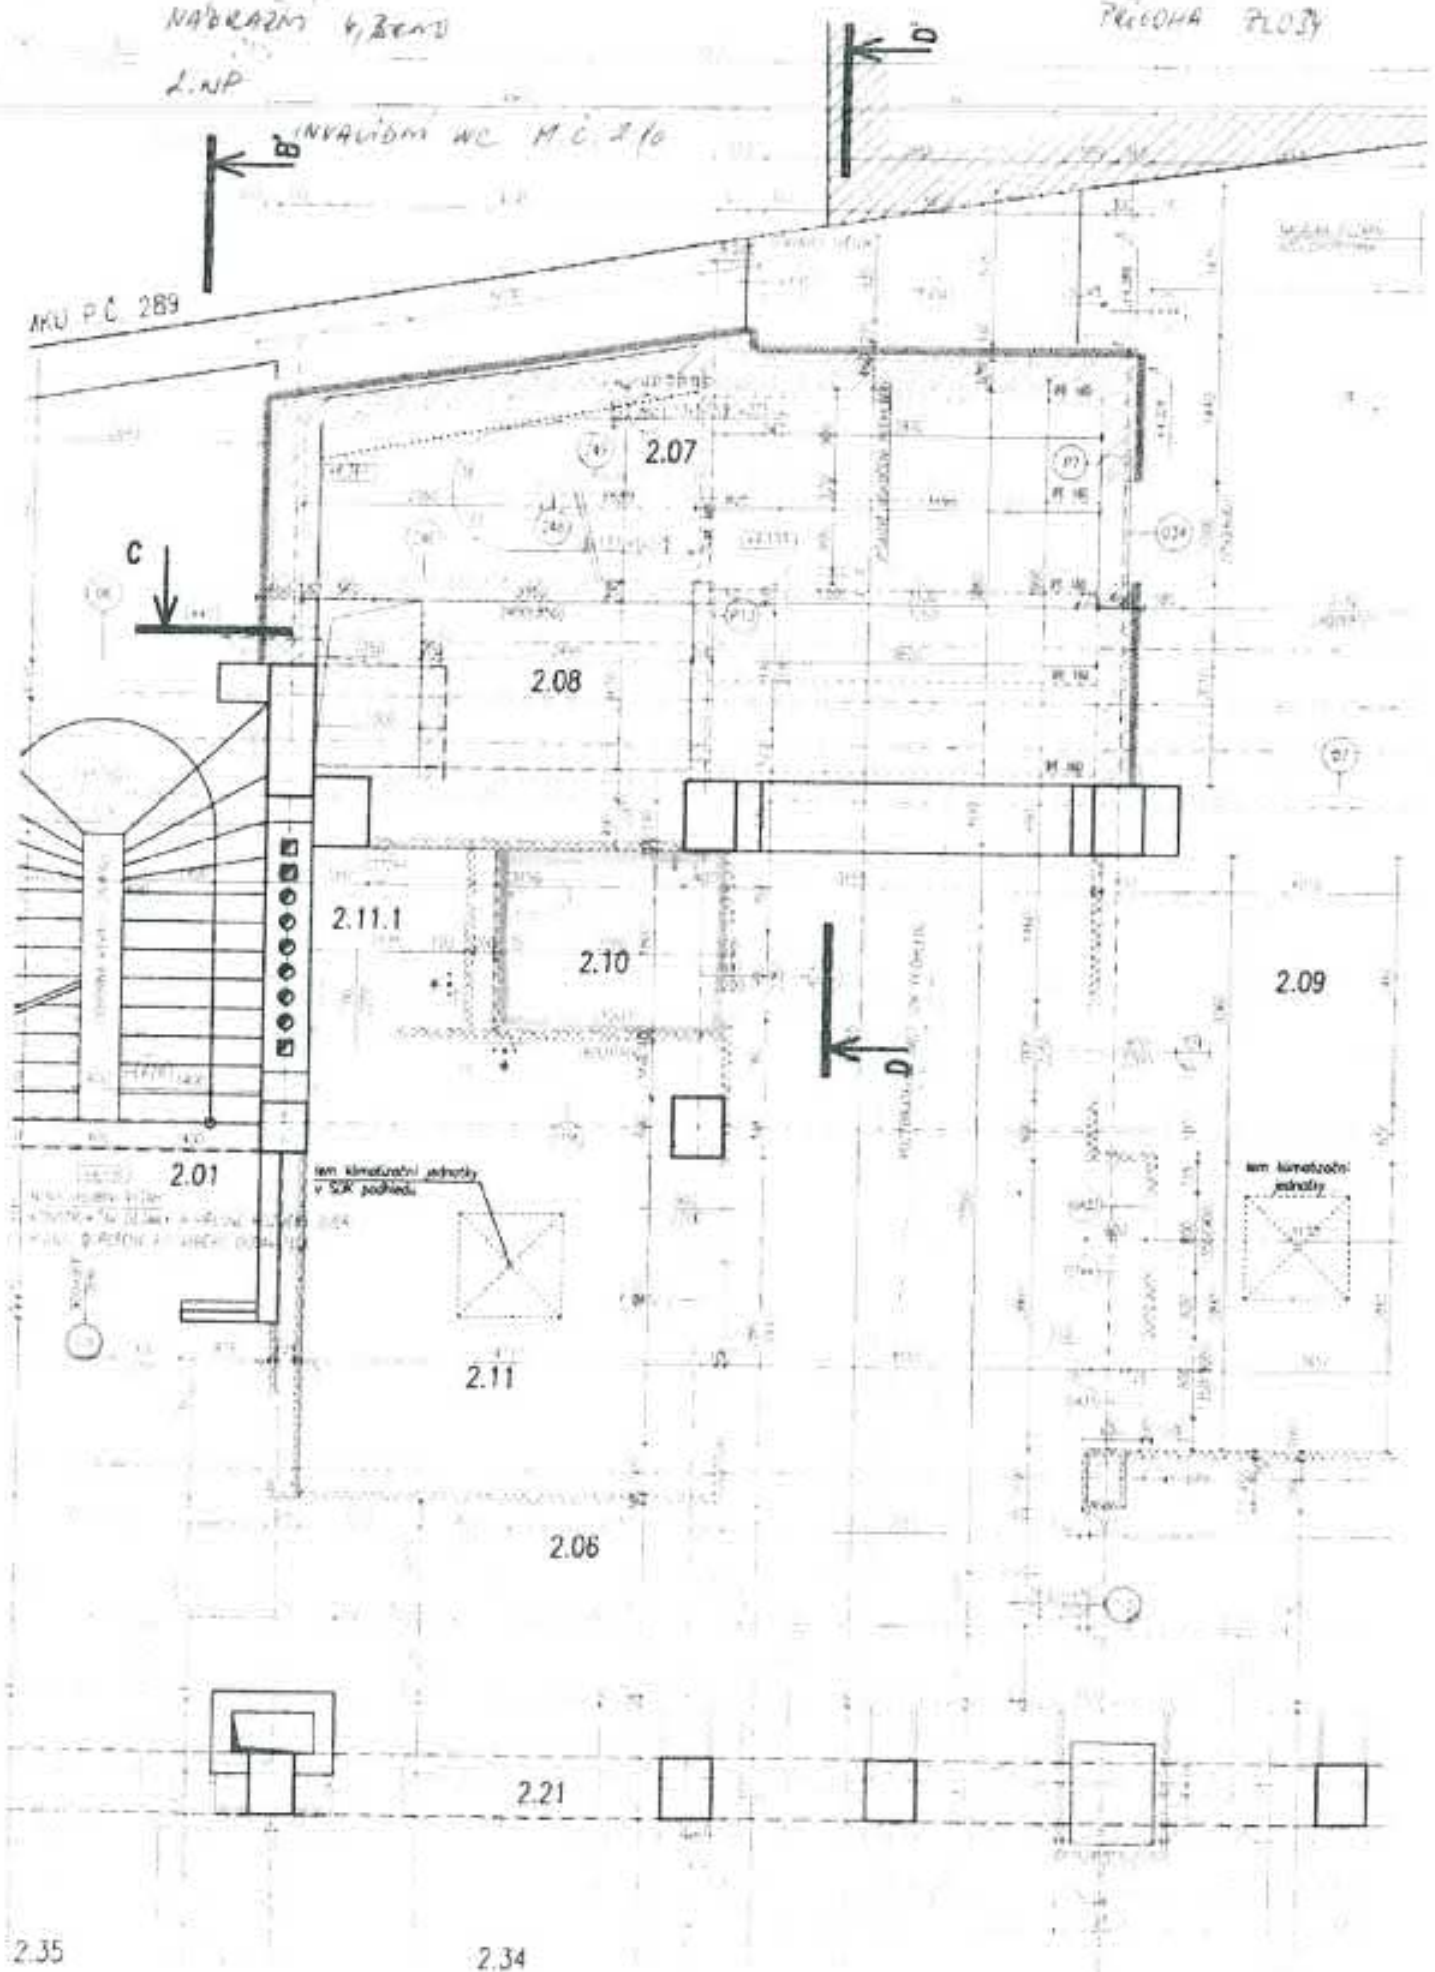

Protokol o změně díla

Změnový list č. 35

Předmět díla	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt	Nádražní 4, Brno		
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	[REDACTED]		
Popis změny	Dle dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k rozhodnutí, že budou na vodovodní a d'ezové baterie montovány periatory. Periatory zajišťuje provzdušnění vody a související vodní proud. dochází tak ke snížení objemu protékající vody. Instalace baterie má tak u daného objektu environmentální a finanční výhody		
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SO (deníku změn)	X
	dodatek k PD		
	dokumentace skutku provedení		X
	jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	21 063,41 Kč	0,03%
	Výše DPH sazba: 15%	3 159,51 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	24 222,92 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-34 (bez DPH)	1 170 262,77 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 776 392,93 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	85 992 851,87 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-284,75 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	21 348,16 Kč	0,03%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	21 063,41 Kč	0,03%
termín	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat.zástupce)	1.4.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedouc)	1.4.2022	
	TDI	1.4.2022	
	Proj.	1.4.2022	
	Objednatel (stat.zástupce)		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.035 - Periatory a úsporné sprchové hlavice		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL035 Perlátory a úsporné sprchové hlavice

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
 15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			21 063,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 063,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	21 063,41 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 21 063,41 CZK

v DRUH

dne

1.4.2022

Za obj

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zafizovací předměty	PSV			21 063,41	100
Cena celkem					21 063,41	100

Položkový rozpočet

S:	STL1807301	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:		Změnové listy
R:	ZL035	Perlátoři a úsporné sprchové hlavice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				21 063,41
1	725759301RZL029	Montáž laboratorního vytokového ventilu	kus	62,00000	85,43	5 296,66
		perlátor do vodovodní a dřezové baterie 62		62,00000		
2	55102004R	Sítka - perlátor XT0220PB do baterie	kus	62,00000	236,00	14 632,00
3	55144162R	Sprchová ručice úsporná, Sprchový set Crometa 85 1 Jet EcoSmart Green	kus	1,00000	1 419,50	1 419,50
4	55145350R	Ručice sprchová plochá, 3 funkce d 118 mm 953 00	kus	-1,00000	-284,75	-284,75
Celkem						21 063,41

Poznámky uchazeče k zadání

Protokol o změně díla

Změnový list č. 36

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt	Nádražní 4, Brno		
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant	[REDACTED]		
Popis změny Při napojování na stávající kanalizační přípojku, objektu masna, v 1. PP byl zjištěn havarijní stav potrubí i betonové kanalizační šachty. Šachta byla zborcená vč. napojovaného kanalizačního potrubí. S ohledem na hygienickou bezpečnost a nutnost zprůchodnění potrubí pro odtékající vody do kanalizace bude instalována nová plastová šachta vč. napojovacího potrubí objektu na stávající kanalizaci.			
údaje o změně	Změnu vyvolat:	po domluvě TDI, STRABAG a.s., projektanta a objednatele	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	37 797,73 Kč	0,05%
	Výše DPH sazba: 15%	5 669,66 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	43 467,39 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-35 (bez DPH)	1 191 326,18 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 814 190,66 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	86 036 319,26 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-1 668,18 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	39 465,91 Kč	0,05%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	37 797,73 Kč	0,05%
termín	Termín realizace změny:	02/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	01.04.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.04.2022	
	TDI:	1-4-2022	
	Proj. [REDACTED]	1-4-2022	
	Objednatel (stat. zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.036 - Havarijní stav kanalizační šachty 1.PP Výkresová část - Půdorys 1.PP		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4, BRNO

Objekt: Stavební část

Rozpočet: ZL036 Havarijní stav kanalizační šachty 1.PP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
 15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 204,47
PSV			8 593,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			37 797,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	37 797,73 CZK
Snížená DPH	15 %	5 669,66 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 43 467,39 CZK

v BRNO dne 01.04.2022



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 270,56	19
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 113,91	6
8	Trubní vedení	HSV			10 149,00	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 603,38	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 284,67	9
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 261,44	27
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 668,18	-4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 782,95	5
Cena celkem					37 797,73	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4. BRNO
O:	Stavební část
R:	ZL036 Havarijní stav kanalizační šachty 1 PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 270,56
1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,30000	781,60	2 513,28
2	139801102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3	3,30000	537,03	1 772,20
		3*1,1*1		3,30000		
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	3,30000	104,53	344,95
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	3,30000	92,48	305,18
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,30000	112,42	370,99
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku	m3	3,30000	111,85	368,45
7	58337333R	Nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4				
		Slépkopisek frakce 0-32 A	t	5,28000	302,18	1 595,51
		3,3*1,6		5,28000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 113,91
8	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým ryh v dosavadních mazaninách	m3	0,49500	4 270,83	2 113,91
Díl: 8		Trubní vedení				10 149,00
9	894431411RA0	Šachta D 600 mm, dl šach roury 1,00 m, přímá	kus	1,00000	10 149,00	10 149,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 603,38
10	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	5,00000	731,00	3 655,00
11	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m²	m3	0,69500	1 384,57	948,38
		podlaha : 3*1,1*0,15		0,49000		
		původní kanalizační šachta : 0,2		0,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 284,67
12	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	6,53730	502,48	3 284,67
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 261,44
13	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	5,00000	854,25	4 271,25
14	28651707.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	2,00000	547,40	1 094,80
15	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000	273,70	273,70
16	28651843.AR	Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC	kus	1,00000	1 343,85	1 343,85
17	28651859.AR	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	2,00000	1 617,00	3 234,00
18	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,03002	1 460,21	43,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-1 668,18
19	7662001006	T8:Ocelový kryt 600x800, specifikace dle výpisu.D+M	kus	-1,00000	1 668,18	-1 668,18
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 782,95
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,59390	92,84	426,50
21	979061111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,53130	95,71	146,56
22	979061121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,62600	-6,86	204,58
23	979062111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,53130	133,92	205,07
24	979062121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,53130	14,93	22,86
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,53130	166,81	255,44
26	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,53130	340,85	521,94


Celkem

37 797,73

Poznámky uchazeče k zadání

1 PP

KANALIZAČNÍ JACHTA (1 KRYJÍ STUP)

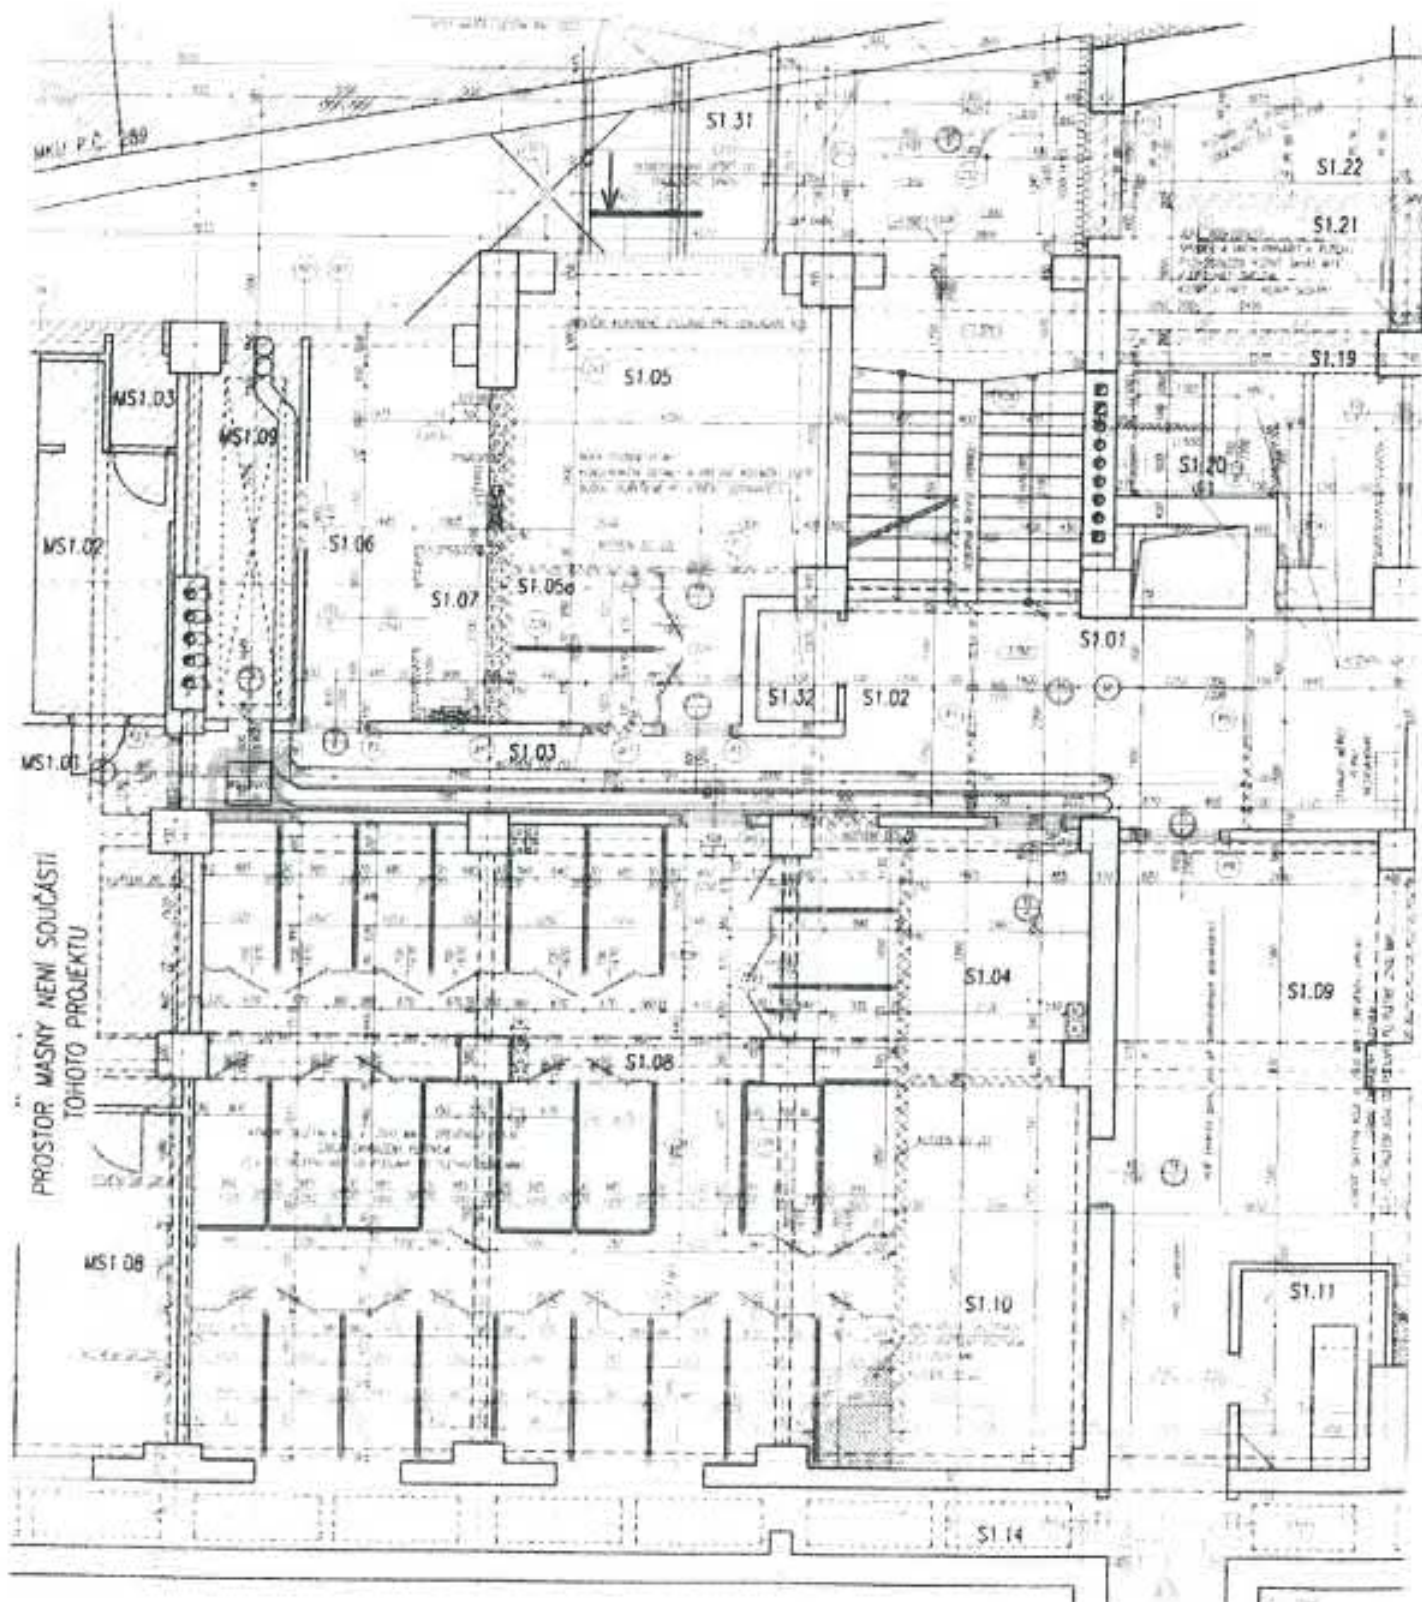

Protokol o změně díla

Změnový list č. 37

Předmět díla	Oprava objektu Nádraží 4, Brno		
Objekt	Nádraží 4, Brno		
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:			
Projektant			
Popis změny Ve 3 NP se v místnostech matřiky nachází 9 ks otopných litinových těles. Jejich vzhled nezapadal již k nově rekonstruovanému prostoru a bylo dohodnuto tyto radiátory natřít vč provedení souvisejících prací s nátěrem. Celý prostor tak nebude vizuálně narušovat původní stav radiátorů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut provedení		x
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	21 141,23 Kč	0,03%
	Výše DPH sazba: 15%	3 171,18 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	24 312,41 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-36	1 229 123,91 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 835 331,89 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	86 060 631,67 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	21 141,23 Kč	0,03%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	21 141,23 Kč	0,03%
termín	Termín realizace změny:	02/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce)	01.04.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)	01.04.2022	
	TDI:	1.4.2022	
	Proj.	1.4.2022	
	Objednatel (stat. zástupce)		
přílohy	Přílohy		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 037 - Nátěry ÚT matřika 3.NP Výkresová část - Půdorys 3.NP (zaznačení radiátorů)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet ZL037 Nátěry radiátorů

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4,
15800 Praha 5 - Jlnonice

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			399,60
PSV			20 741,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 141,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	21 141,23 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 21 141,23 CZK

v Brno dne 01.01.2022



Za




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
041	Demontáže	HSV			399,60	2
735	Otopná tělesa	PSV			5 364,75	25
783	Nátěry	PSV			15 376,88	73
Cena celkem					21 141,23	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NADRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL037 Nátěry radiátorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 041		Demontáže				399,60
1	041-03	Demontáž otopného tělesa	ks	2,00000	199,80	399,60
Díl: 735		Otopná tělesa				5 364,75
2	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových 3.31. 3.32 2*(27*0,18*0,6*2)	m2	11,66400	277,53	3 237,11
3	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles celkový počet radiátorů 3 NP masnika - B	kus	9,00000	24,99	224,91
4	735191910R00	Nápuštění vody do otopného systému - bez kotle Odkaz na mn. položky pořadí B - 30.27600	m2	30,27600	12,50	378,45
5	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles Odkaz na mn. položky pořadí B - 30.27600	m2	30,27600	21,00	635,80
6	735-49	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 20m	soubor	1,00000	888,48	888,48
Díl: 783		Nátěry				15 376,88
7	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči Odkaz na mn. položky pořadí B - 30.27600	m2	30,27600	203,58	6 163,59
8	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email 3.38 - 6*0,14*0,65*2 6*0,22*1,1*2 3.39 - 22*0,14*0,6*2 3.26 - 16*0,14*0,6*2 6*0,14*0,6*2 3.31 - 3.32 2*(27*0,18*0,6*2) 3.33 - 22*0,14*0,6*2 3.34 - 21*0,14*0,6*2	m2	30,27600	249,48	7 553,28
9	783903811R00	Omáštění chemickými rozpouštědly Odkaz na mn. položky pořadí B - 30.27600	m2	30,27600	54,83	1 660,03
CELKEM						21 141,23

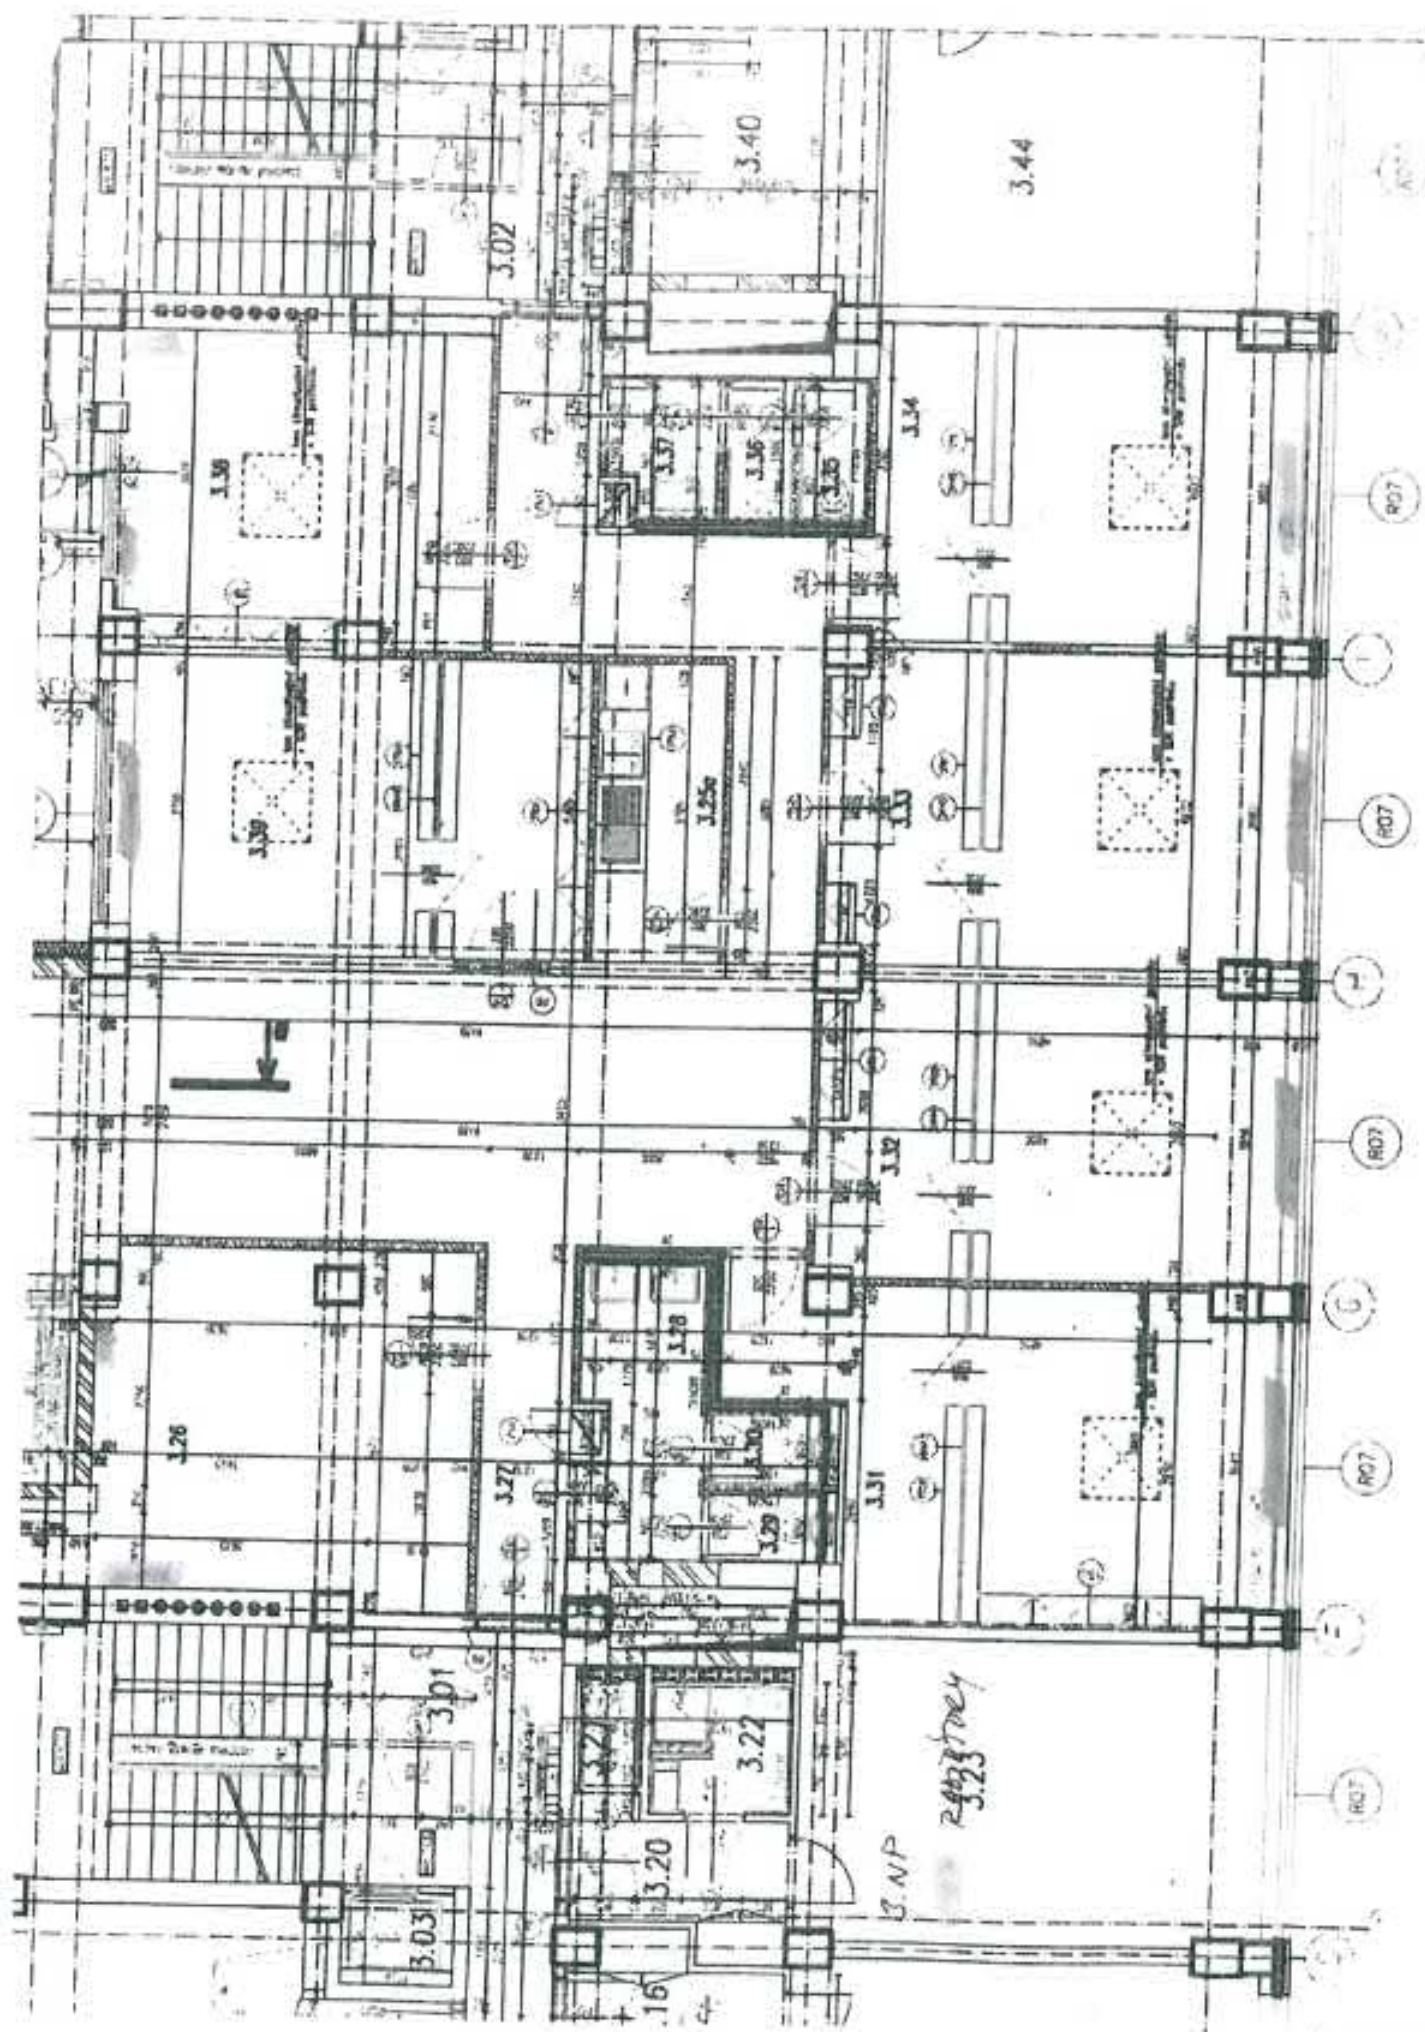

Protokol o změně díla

Změnový list č. 38

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:	Místnost č. S1.17 v 1.PP bude sloužit jako archiv matriky. V prostoru se u stropu nachází několik potrubí. Po dohodě mezi TDS, objednatelem, zhotovitelem a projektantem byla navržena konstrukce pojistných žlabů v celé trase tohoto potrubí. Žlaby budou mít funkci bezpečnostní, kdy v případě poruchy potrubí, a tedy úniku média zabrání poškození dokumentace v archivu.		
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD		
	dokumentace skutku provedení	☒	
	jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	46 634,32 Kč	0,06%
	Výše DPH sazba 15%	6 995,15 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	53 629,47 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-37 (bez DPH)	1 250 265,14 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	74 881 966,21 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	86 114 261,14 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	46 634,32 Kč	0,06%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	46 634,32 Kč	0,06%
termín	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (stat. zástupce):	01.04.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.04.2022	
	TDI:	01.04.2022	
	Proj:	01.04.2022	
	Objednatel (stat. zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.038 - Pojistné žlaby archiv matrika		
	Výkresová část - Půdorys 1.PP (zaznačení pojistných žlabů)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL038 Pojistné žlaby archiv Matrika

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, DIČ: CZ60838744
15800 Praha 5 - Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			46 634,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 634,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	46 634,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 46 634,32 CZK

v BRNĚ dne 01.04.2022

Za

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			32 454,14	70
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 180,18	30
Cena celkem					46 634,32	100


Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL038 Pojistné žlaby archiv Matrika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				32 454,14
1	764351205R00	Žlaby z Pz plechu, rš 400 mm	m	36,21000	533,80	19 328,90
		4 žlaby uchycené na atypickou konstrukci, s ohledem na málo prostoru víceúrovňe na montáž : 3*9,57*17,5		28,71000		
				7,50000		
2	764351291R00	Montáž žlabů Pz, rš 400 mm	m	36,21000	204,00	7 386,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 36,21000		36,21000		
3	764357291R00	Montáž žlabů Pz, rš 1600 mm	m	2,10000	816,85	1 715,39
		vč. dodávka a montáž podkladní lepenky				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,10000		2,10000		
4	764357205R00	Žlaby z Pz, bez háků, rš 1600 mm	m	2,10000	1 654,10	3 473,61
		zakončení žlabů v jedné trase, opracování stávajících potrubí : 2,1		2,10000		
5	998764104R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	t	0,16552	3 319,24	549,40
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				14 180,18
6	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	258,00000	55,05	14 092,80
		Závěsné hrazdy - podpurná konstrukce				
		vyzružení konstrukce, vč. spojovacího materiálu				
7	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	140,92800	0,62	87,38
CELKEM						48 634,32

1.74 - 1000. 8.1.12

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

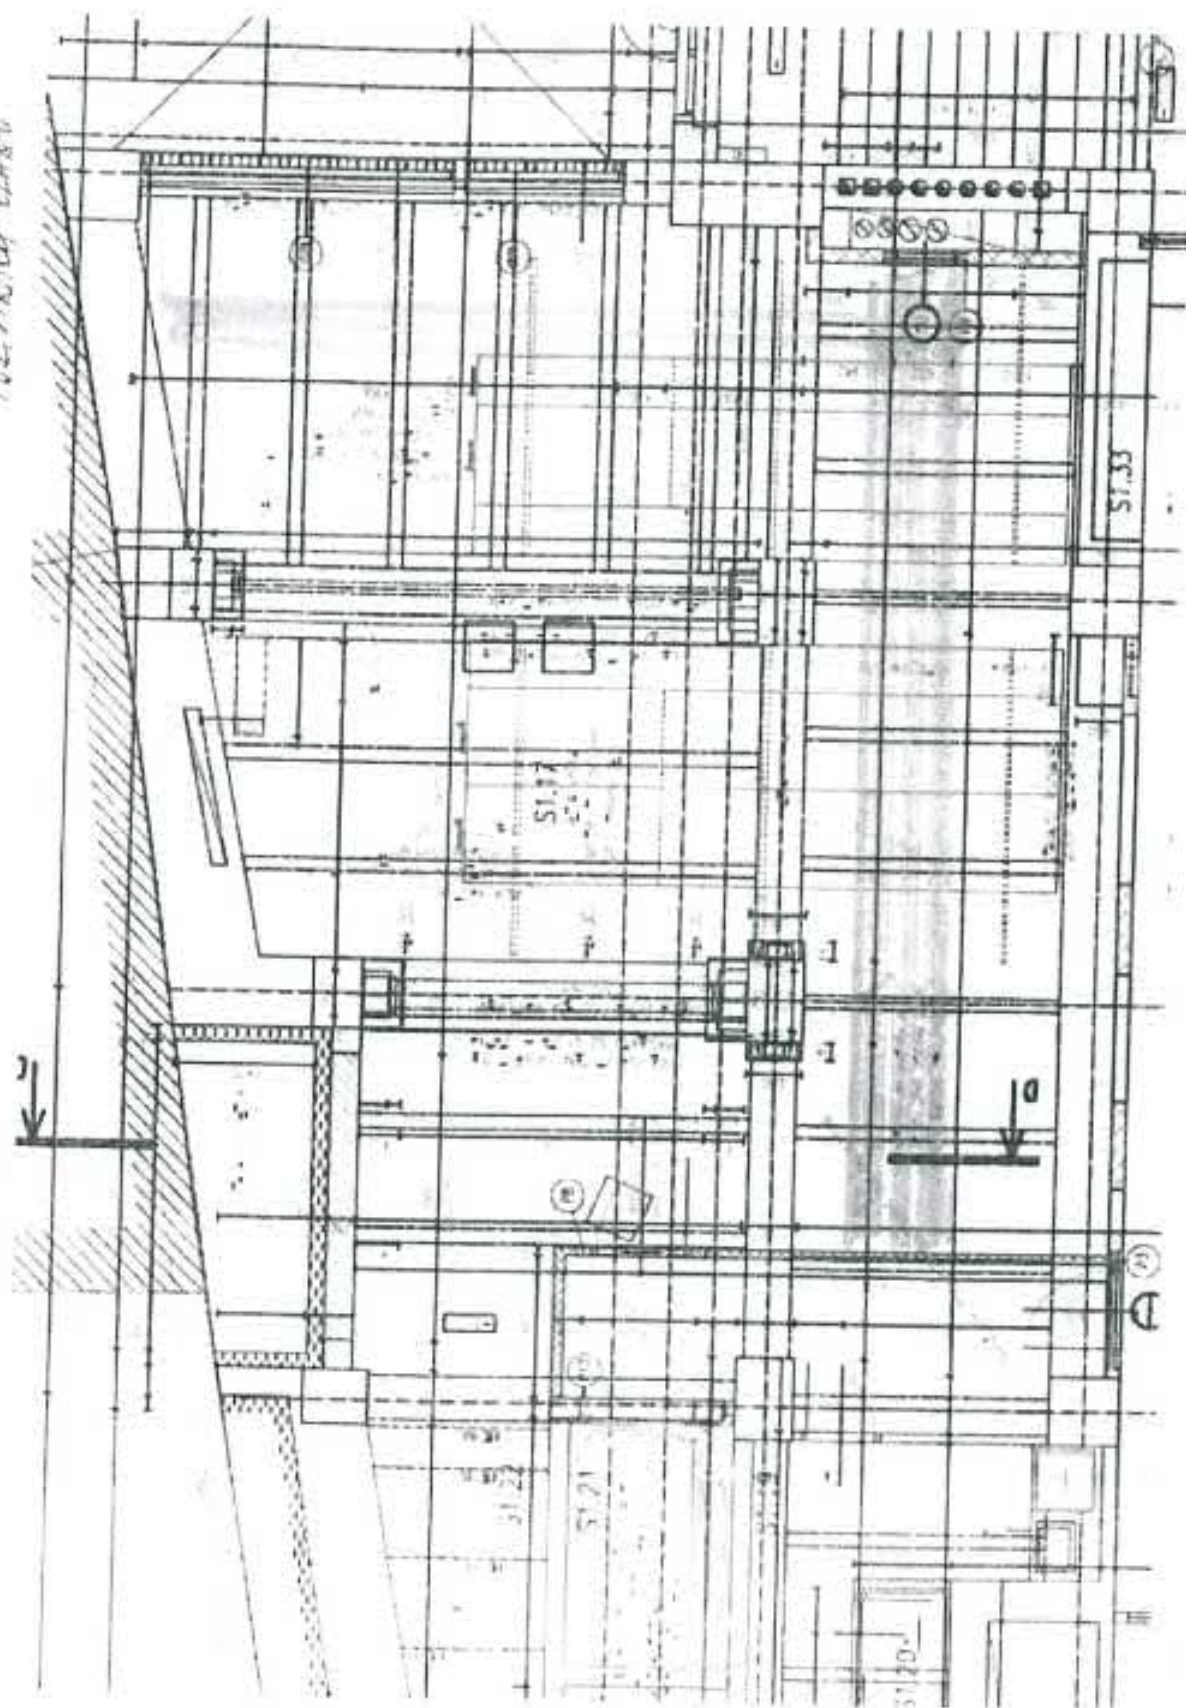

Protokol o změně díla

Změnový list č. 39

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:	Na základě požadavku investora byla změněna dispozice úřadu matky v 1 PP-3 NP. Z tohoto důvodu jsou navrženy změny v části vzduchotechniky. Změny jsou spojeny s délkou, velikostí a trasou potrubí a doplněním klimatizace, případně odstraněním potrubí. Nově vzniklá místnost 2.11.1, která bude sloužit jako přebal koutek bude nově odvětrávána vzduchotechnikou. Do místnosti č. 2.13 bude doplněno také odvětrávání. Původní jednotka z m.č. 2.11 bude přesunuta na chodbu podlaží 2.NP. Do prostoru 2.11 bude následně doplněna nová klimatizační jednotka. Do m.č. 2.31 bude také přidána nová klimat. jednotka. Dle požadavku bude doplněno chlazení serverovny - m.č. 2.26. V recepci, v nové místnosti 1.14 vznikla místnost 1.14d - rozvodna LDP. S ohledem na tuto změnu bude instalován nový anemostat do m.č. 1.14. V m.č. 1.14d bude osazen nový ventilátor pro dotah vzduchu. Dle nálezu stavu skutečného tvaru stropů a na základě možnosti provedení prostupů přes strop dojde k úpravám potrubí větrání CHUC. Průřez potrubí se změni na 1000x300mm, tak aby byla zachována světlá výška pro regály. Potrubí bude zakončeno novou mřížkou, osazenou v m.č. 1.02 - tj. ve vstupní hale. Úpravení trasy potrubí pro odvětrávání CHUC bude provedeno v 1.PP, v suterénu. Zároveň bude změna ve velikosti potrubí na 1000x300mm. Původní potrubí bude odpočítáno (méněpráce). Potrubí vzduchotechniky z archivu bude přesunuto do chodby S1.22 z důvodu neomezení světlé výšky v prostoru.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - do minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	170 945,28 Kč	0,23%
	Výše DPH sazba: 15%	25 641,79 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	196 587,07 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-38 (bez DPH)	1 296 899,46 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	75 052 911,49 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	86 310 848,21 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-18 880,00 Kč	-0,03%
	Vícepráce celkem bez DPH	189 825,28 Kč	0,26%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	170 945,28 Kč	0,23%
termín	Termín realizace změny:	03/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat.zástupce):	01.04.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.04.2022	
	TDI:	7.4.2022	
	Proj:	7.4.2022	
	Objednatel (stat.zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.039 - Vzduchotechnika 1 PP-3 NP		
	Výkresová část (výřezy místností) a Průvodní popis (změna dispozice)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL039 Vzduchotechnika 1.PP-3.NP

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
 15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			96 702,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			96 702,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	170 945,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 170 945,28 CZK

v Beně dne 01.09.2022

Za ob

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Změny 2NP	HSV			96 702,24	57
2	Změny 1NP	HSV			34 211,04	20
3	Změny 1PP	HSV			58 912,00	34
4	Měněpráce	HSV			-18 880,00	-11
Cena celkem					170 945,28	100


Položkový rozpočet


S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL039 Vzduchotechnika 1.PP-3.NP


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Změny 2NP				96 702,24
1		spiro prům. 200	bm	12,00000	440,35	5 284,20
2		požární izolace	m2	5,00000	455,48	2 277,40
3		ventil prům 200	ks	1,00000	413,00	413,00
4	větrání místnosti 2.13	spiro prům. 160	bm	10,00000	394,12	3 941,20
5		izolace požární	m2	4,00000	455,48	1 821,92
6		ventil prům. 160	ks	3,00000	318,80	955,80
7		chlazení místnosti 2.11	ks	1,00000	13 557,56	13 557,56
8		chlazení místnosti 2.31	ks	1,00000	13 557,56	13 557,56
9	klimat. serveru m.č. 2.28	kondenz. jednotka	ks	1,00000	18 871,74	18 871,74
10		vnitřní nástěnná jednotka 2,5kW	ks	1,00000	7 701,86	7 701,86
11		Cu potrubí	bm	30,00000	944,00	28 320,00
Díl: 2		Změny 1NP				34 211,04
12	místnost 6.11	anemostat	ks	1,00000	2 371,80	2 371,80
13		spiro prům. 225	bm	2,50000	440,35	1 100,88
14		doplnění požární izolace na rozvodech potrubí	m2	10,00000	455,48	4 554,80
15		doplnění žaluzie 1000x300	ks	1,00000	3 776,00	3 776,00
16		potrubí do obj. 3000	m2	6,00000	590,00	3 540,00
17	místnost 101.	chlazení	ks	1,00000	13 557,56	13 557,56
18		doplnění radiálního ventilátoru místnost 1.14d	ks	1,00000	5 310,00	5 310,00
Díl: 3		Změny 1PP				58 912,00
19		přívodní potrubí 1000x300	m2	41,60000	590,00	24 544,00
20		doplnění požární izolace	m2	65,00000	455,48	29 606,20
21		spiro prům 200	bm	8,00000	440,35	3 522,80
22		ventil prům 200	ks	3,00000	413,00	1 239,00
Díl: 4		Měněpráce				-18 880,00
23		odpočet potrubí 500x500	bm	-32,00000	590,00	-18 880,00
Celkem						170 945,28



**Průvodní popis „Položkového soupisu prací a dodávek – Změna dispozice
1.PP-3.NP – Vzduchotechnika“**

- 1 Úprava vzduchotechniky na základě změny dispozice, týkající se FamilyPointu a WC pro veřejnost s vybudováním nové místnosti s označením 2.11.1, která bude sloužit jako přebalovací koutek a bude odvětrávána pomocí VZT
- 2 Pro místnost 2.13 bylo přidáno odvětrávání
- 3 Původní jednotka z místnosti 2.11 byla přesunuta na chodbu podlaží 2.NP, do prostoru 2.11 byla následně doplněna nová klimatizační jednotka
- 4 Do místnosti 2.31 byla přidána klimatizační jednotka
- 5 Dle požadavku bylo doplněno chlazení serverovny 2.26.
- 6 Nazváno dle původního označení 6.11 – jedná se o prostor recepce 1.14. Došlo zde k přidání místnosti 1.14d, která slouží jako rozvodna LDP ze vstupem z prostoru recepce. Na základě této dispoziční úpravy bylo nutné přidat jeden anemostat do prostoru 1.14 (anemostat, který tam byl původně se přesunul do nového prostoru 1.14d, prolo bylo nutné přidat další).
- 7 Jedná se o úpravy potrubí větrání CHUC na základě zjištěných tvarů stropů a na základě možnosti provedení průstupů přes strop. Došlo k úpravě průřezu potrubí na 1000x300 mm tak, aby se v archivu zachovala co nejlepší světla výška pro regály. Na základě toho byla upravená mřížka, větrání CHUC osazena ve vstupním prostoru 1.02, průřez stoupacího potrubí vedoucího nad střechu ve dvorku a potrubí pod stropem 1.PP, které je řešené v bodu č. 10 a 11.
- 8 Na základě dispozičních úprav recepce byla přidána klimatizační jednotka v místě navrhovaného pultu recepce.
- 9 Pro zajištění toku vzduchu v místnosti 1.14d (nová rozvodna LDP) byl do místnosti osazen ventilátor, který bude sloužit pro odtah vzduchu v místnosti.
- 10 Na základě úpravy dispozice archivu v suterénu 1.PP byla upravena trasa potrubí, které slouží pro větrání CHUC ve vstupních prostorách objektu. Zároveň došlo ke zplacatění průřezu objektu na rozměr 1000x300 mm tak, aby se zachovala co největší možná světla výška v archivu. Pro zachování světla výška pak došlo i k úpravě vzduchotechniky, která slouží přímo pro odvětrávání prostoru archivu s ohledem na to, aby neomezovali světla výšku místnosti potřebnou pro umístění regálů s tím, že hlavní trasy těchto potrubí se přemístili do nového prostoru chodbičky S1.22, která slouží jako propojení prostoru archivu s novým výtahem.
- 11 Tento bod řeší odpočet původního potrubí pro větrání CHUC, které se nahradilo placatějším potrubím 1000x300 mm.

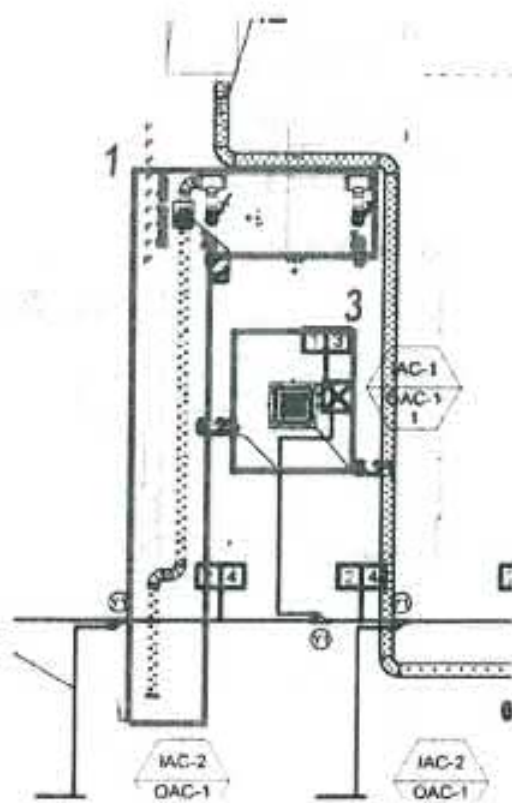


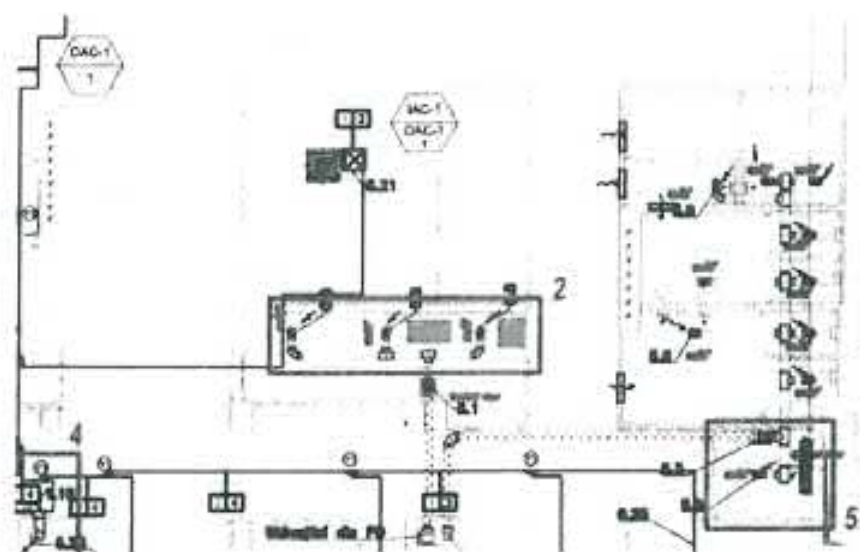

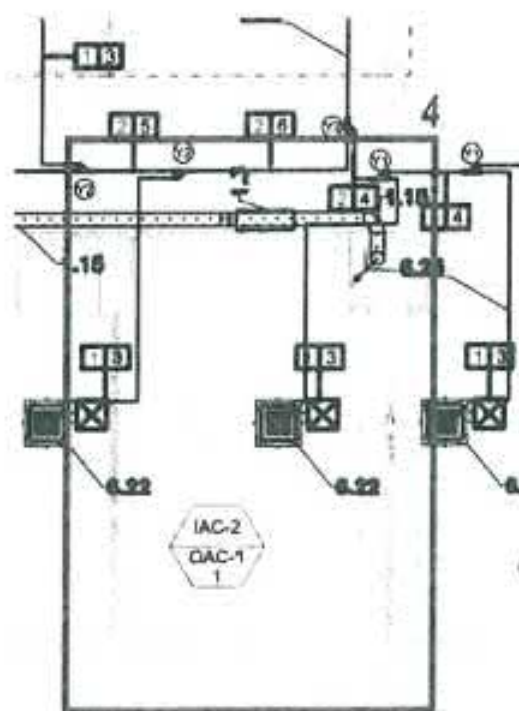

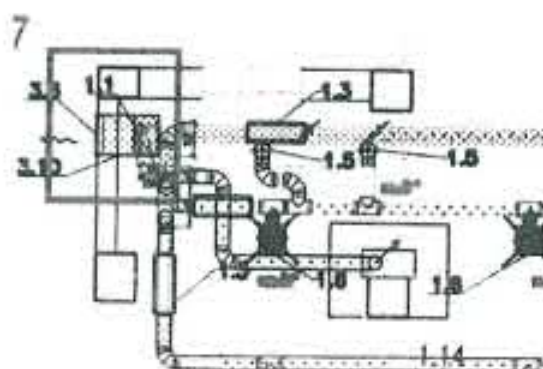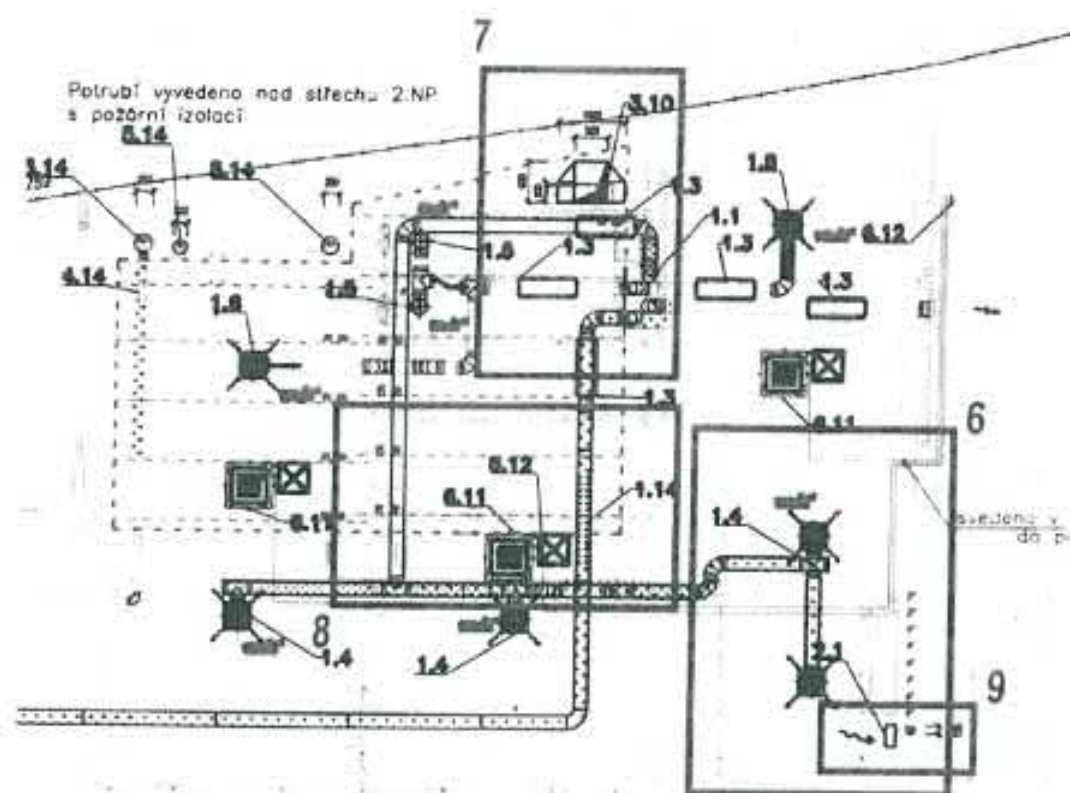

10-11

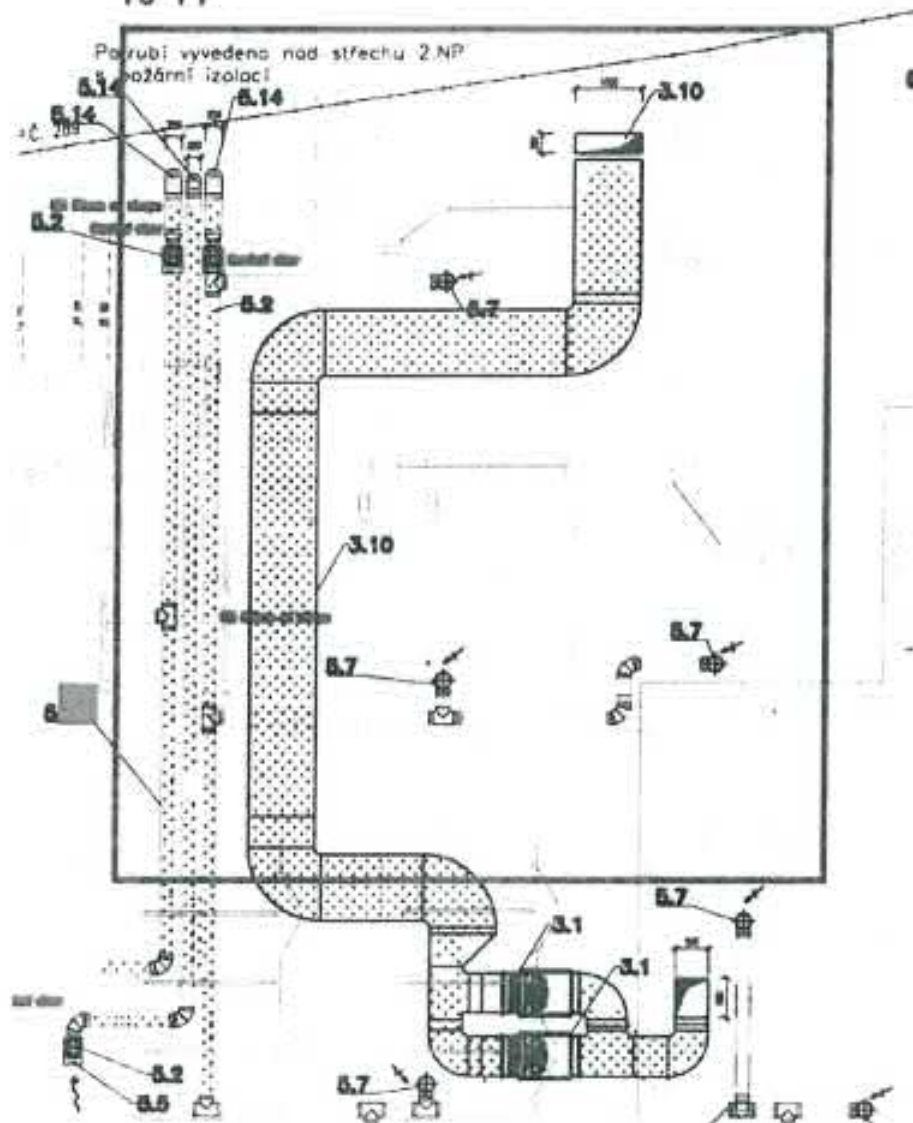

Protokol o změně díla

Změnový list č. 40

Předmět díla	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt	Nádražní 4, Brno		
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	[REDACTED]		
Popis změny	Odpadní výťah je dle PD navržení, pro přemístění kontejnerů na odpad, z uliční části ul. Nádražní. Dle PD byla plošina stanovena plochou 900x900mm. Dodavatel je schopen zajistit větší zvedací plošinu rozměrově 1150x1800mm, nosnost max 250kg za stejnou cenu stanovenou smlouvou o dílo, mezi objednatel a dodavatelem. Hydraulická zvedací plošina bude zajištěn do suterénu objektu, Nádražní 4, tak jak bylo zamýšleno. Nedochází ke zužení ani k rozšíření předmětu díla, tato změna nemá vliv na cenu díla.		
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zužení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 7 ZZVZ - záměna položek soupisu prací	
	Způsob projekčního řešení změny		
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Výše DPH sazba:	15%	0,00 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 068,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-39 (bez DPH)	1 467 844,74 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	75 052 911,49 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	86 310 848,21 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-455 968,11 Kč	-0,62%
	Vícepráce celkem bez DPH	455 968,11 Kč	0,62%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	0,00 Kč	0,00%
Termín	Termín realizace změny:	04/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	01.04.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.04.2022	
	TDI:	7.4.2022	
	Pro:	1.4.2022	
	Objednatel (stat. zástupce):		
Přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.040 - Zvedací plošina, záměna		
	Výkresová část - Vodorovný a svislý řez (hydraulické zvedací plošiny)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL040 Zvedací plošina záměna

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
 15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		0,00 CZK

v Brně dne 01.04.2022

Za

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL040 Zvedací plošina_záměna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				0,00
1	833M10004	Výtah MB 250 kg 2/2 stanic, odpočet původně navrženého výtahu výroba, dodávka, montáž velikost zvedací plošiny 900x900mm	ks	-1,00000	455 968,11	-455 968,11
2	833M10005	Výtah 2 stanice výroba, dodávka, montáž vč. technologie a oeklopu, nosnost 250kg velikost zvedací plošiny 1150x1800mm	ks	1,00000	455 968,11	455 968,11
Celkem						0,00

A4

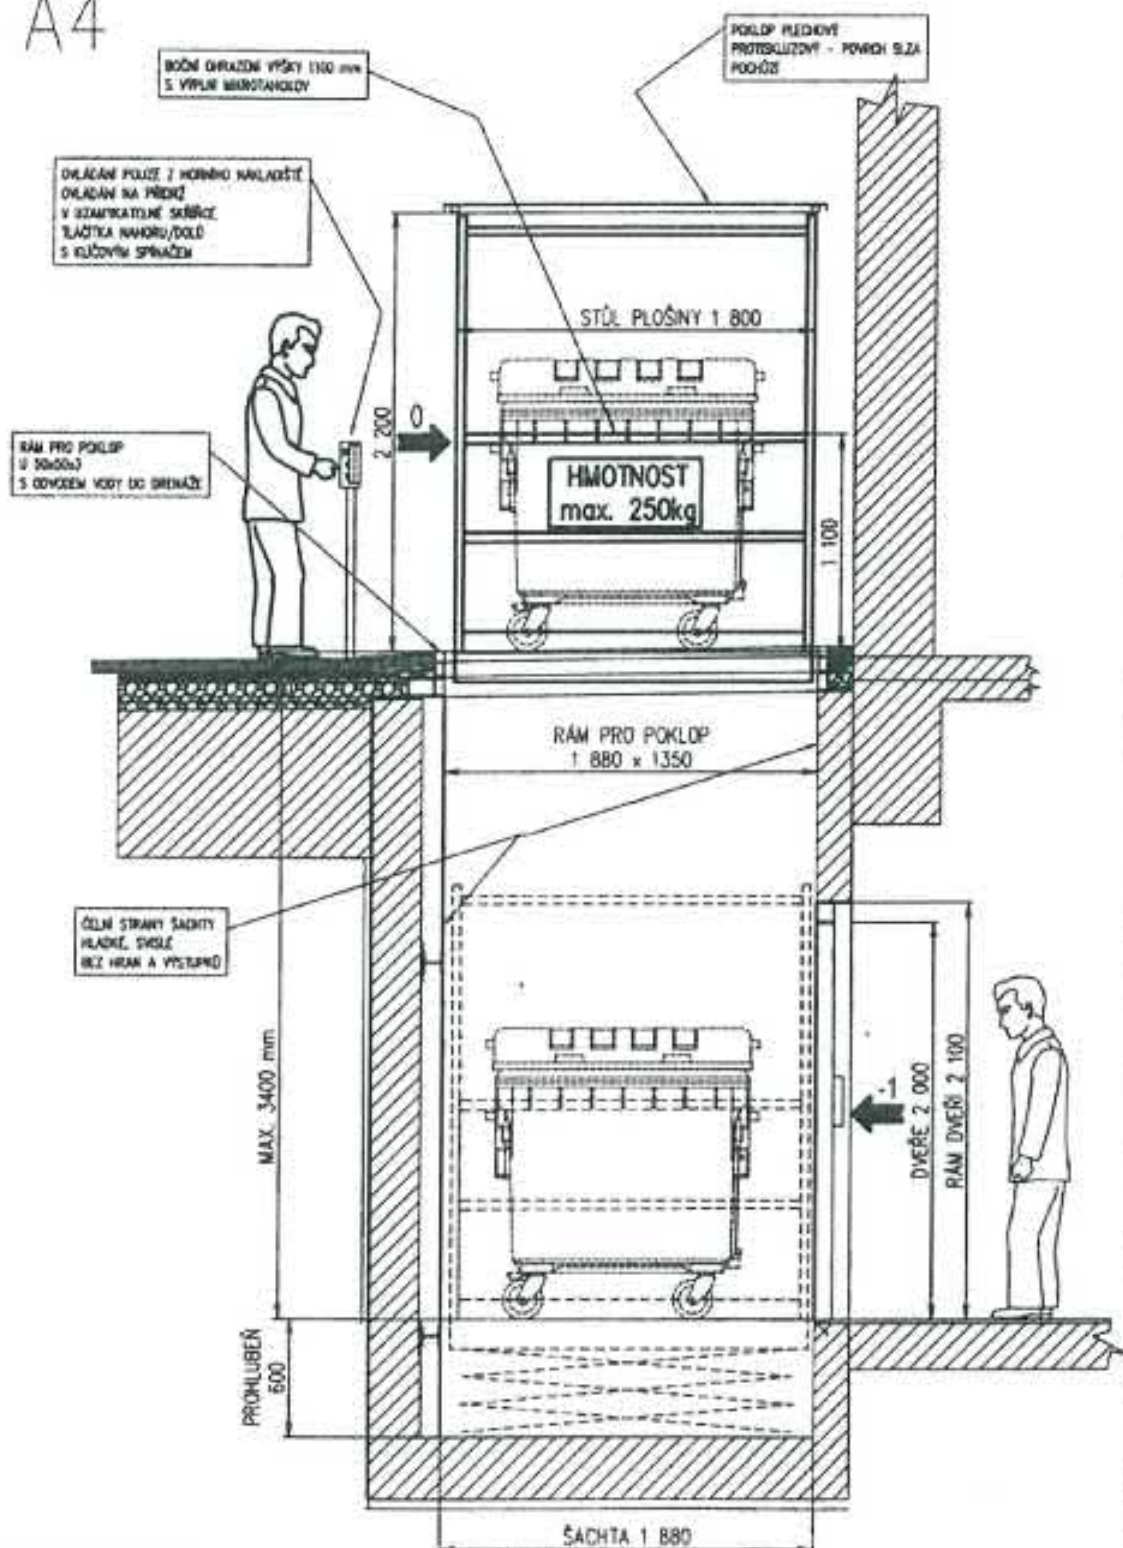

LIFTEX PRO

Provozovna: 84664 122 00 Dobruška
tel.: +420 604 408 330
www.liftex.cz - liftex@liftex.cz

NÁZEV

SVISLÝ ŘEZ
Zvedací plošina HZP250


LX22.357-02

A4

PARAMETRY ZVEDACÍ PLOŠINY :

- UŽITNÁ LOŽNÁ PLOCHA 1150 x 1800 mm
- NOSNOST 250 kg
- PODLAHA PLOŠINY - PROTISKLUZOVÝ PLECH
- NA STOLE PLOŠINY BOČNICE S VÝPLNÍ
- BEZ DOPRAVY OSOB II
- V DOLNÍM NÁKLADIŠTI DVEŘE 1150x2000 mm bez P.O.
- V HORNÍM NÁKLADIŠTI POKLOP - PROTISKLUZOVÝ, ŽÁROVĚ ZNÍKOVANÝ
- ZVÝŠ MAX. KONSTRUKČNÍ : 3400 mm
- V HORNÍM NÁKLADIŠTI OHLAČ - PRŮMYSLOVÝ VE SKŘÍŤCE NA SLoupku
- OHLAČNÍ NA PŘÍRŽ
- CELÁ KONSTRUKCE PLOŠINY V ODSTĚHU RAL - VYBERE ZÁKAZNÍK

VODOROVNÝ ŘEZ ŠACHTOU

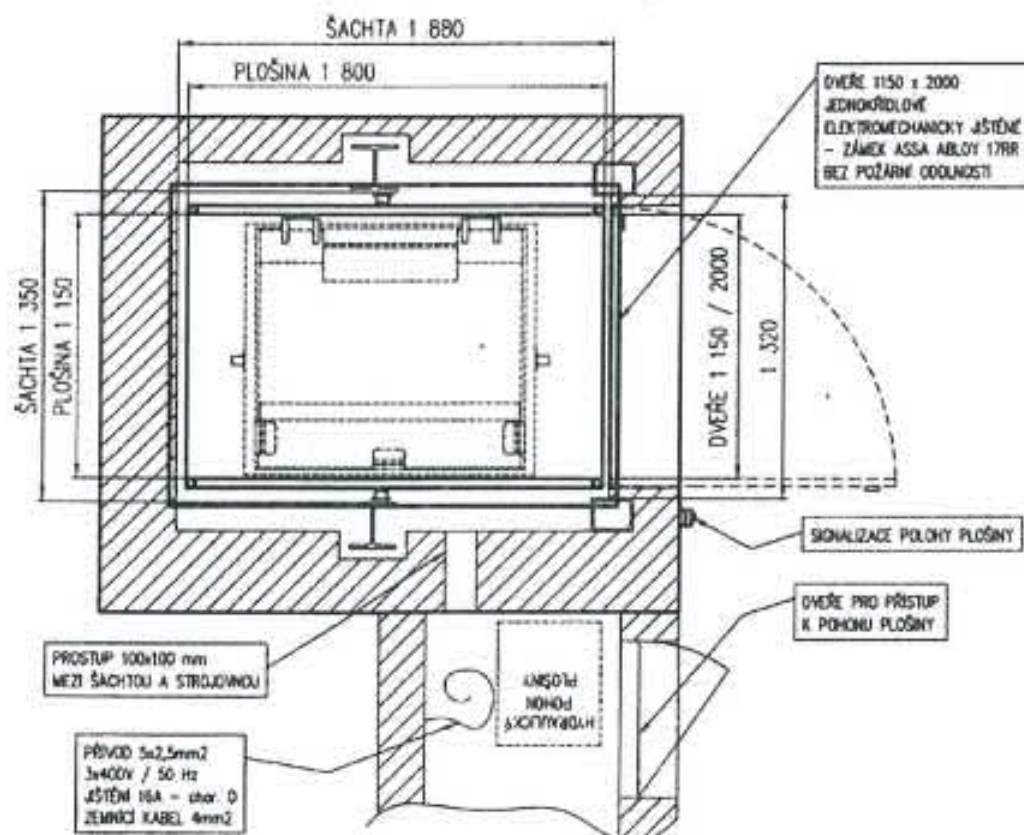

LIFTEX PRO

Provozovna: 54944, 722 00 Opatov
tel: +420 804 498 330
www.lifex.cz lifex@lifex.cz

NAZEV

VODOROVNÝ ŘEZ
Zvedací plošina HZP250

LX22.357-02

Protokol o změně díla

Změnový list č. 41

Předmět díla:	Oprava objektu Nádražní 4, Brno		
Objekt:	Nádražní 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
V PD bylo uvažováno s umístěním odpadního vytahu do stávající výtahové šachty. Po vybourání stěny a odkrytí šachty bylo zjištěno, že realizaci vytahu brání množství slaboproudých a silnoproudých rozvodů, s kterými nebylo v PD uvažováno (provozovatelé nebyli známi). Bylo zjištěno, že zbytková kabeláž spadá pod DPMB, BKOM a Cetin, a je přijatelné přeložit trasy kabeláže. Výstavba šachty vyžaduje dodatečné statické zabezpečení, a to vytvořením nosné ocelové konstrukce včetně postupného podbetonování stávajících základů. V důsledku těchto prací bude nutné realizovat kolem šachty výkop, vytvořit dostatečně velký prostor pro chyb chráničů optických kabelů v poloměru zaručujícím jejich nepoškození. Nad výkopem bude zajištěn bezpečný koridor s přechodovou lávkou a zabezpečením rizika pádu prostřednictvím segmentů mobilního oplocení napevno připevněných k zábradlí lávky. Po montáži izolace, průvlečení zásypu bude pěší komunikace vrácena do původního stavu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 050 914,32 Kč	1,43%
	Výše DPH sazba: 15%	220 692,01 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 271 606,33 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč	
	Součet přechozích ZL 1-40 (bez DPH)	1 467 844,74 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	76 103 825,81 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	87 519 399,68 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-66 019,21 Kč	-0,09%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 116 933,53 Kč	1,52%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	1 050 914,32 Kč	1,43%
termín	Termín realizace změny:	04-05/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stat. zástupce):	01.04.2022	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	01.04.2022	
	TDI:	1.4.2022	
	Proj:	1.4.2022	
	Objednatel (stat. zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.041		
	Výkresová část - Půdorys 1.PP; Půdorys 1.NP; Řez R1-R1'; Půdorys 1PP CETIN; Půdorys 1PP DPMB		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL041 Stavební část - odpadní výtah

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Domínkánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744
15800 Praha-Jinonice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			426 393,71
PSV			402 440,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			222 080,00
Celkem			1 050 914,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 050 914,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 050 914,32 CZK

v Beně dne 01.04.2022



Za o

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			183 615,03	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			69 851,92	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-2 572,92	0
5	Komunikace	HSV			6 083,55	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 520,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 285,40	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96 152,52	9
711	Izolace proti vodě	PSV			63 140,62	6
712	Povlakové krytiny	PSV			13 891,10	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			57 780,00	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			267 628,89	25
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 458,21	0
ON	Ostatní náklady	ON			222 080,00	21
Cena celkem					1 050 914,32	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL041 Stavební část - odpadní výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				183 615,03
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník : 4,0*4,0	m2	16,00000	48,38	790,24
2	132101401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.2 šachta šachta : 2,4*0,45*1,58*2	m3	3,41280	1 213,80	4 142,46
3	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3 výkop chodník : (1,8*3,7+1,2*1,2*2)*5,3 šachta snížení o 200mm : 2,42*1,63*0,2 jímka : 1,63*1,6*0,4	m3	52,39412	537,03	28 137,21
4	151201103R00	Pažení a rozeptění stěn ryh - zátažné - hl. do 8 m 3,7*5,3 (1,2*5,3)*2	m2	32,33000	323,00	10 442,59
5	151201113R00	Odstranění pažení stěn ryh - zátažné - hl. do 8 m Odkaz na min. položky pořadí 4 : 32,33000	m2	32,33000	138,83	4 520,70
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční Odkaz na min. položky pořadí 2 : 3,41280 Odkaz na min. položky pořadí 3 : 52,39412	m3	55,80692	1 291,15	72 055,10
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Aktualizace-Název v DZ: Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odpočet materiálu pro zásep: chodník : (1,4*3,7+1,2*1,2*2)*0,6 jímka : 1,63*0,6*0,4 Množství: Odkaz na min. položky pořadí 6 : 55,80692	m3	50,57972	112,42	5 686,17
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m materiál pro zpětný zásep: chodník : (1,4*3,7+1,2*1,2*2)*0,6 jímka : 1,63*0,6*0,4 Množství: Odkaz na min. položky pořadí 6 : 55,80692	m3	61,03412	104,53	6 379,90
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Odkaz na min. položky pořadí 6 : 55,80692	m3	55,80692	111,85	6 230,84
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním Odkaz na min. položky pořadí 8 : 61,03412	m3	61,03412	204,74	12 496,13
11	58337344R	Štěrkopisek frakce 0-32 B Odkaz na min. položky pořadí 8 : 61,03412*1,8	t	109,86142	286,15	31 656,57
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05.04	t	3,60000	298,20	1 077,12
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				69 851,92
13	273323411R00	Železobeton základ desek vodostavební C 25/30 XC2 (2,42*1,63+0,39*1,63)*0,4	m3	1,83212	2 698,75	4 944,43
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (0,39+0,05)*1,63*2	m2	1,43440	620,05	889,40
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očistění, vytlídění a uložení bednicového materiálu	m2	1,43440	88,68	127,20
16	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu B.D. oka 100/100 mm KY49	t	0,07961	45 432,50	3 616,88

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL041 Stavební část - odpadní výťah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,42*1,63+0,39*1,63)*0,0079*2*1,1		0,07961		
17	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 25 cm výpň tvárníc betonem C 25/30	m2	8,18260	1 276,70	10 446,73
		5,02*1,63		8,18260		
18	279311115R00	Postupné podbetonování základů zdiva C 25/30	m3	4,73280	5 588,75	26 450,44
		2,4*0,45*1,58*2		3,41280		
		2,2*1*0,3*2		1,32000		
19	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranně-zřízení	m2	10,08000	493,83	4 974,78
		2,8*1,8*2		10,08000		
20	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranně-odstran	m2	10,08000	158,04	1 593,04
		Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu				
21	279361621R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,23991	27 602,93	6 670,20
		stěna z betonových tvárníc				
		svislá : (0,5+1,5*3+0,98)*14*0,000888*1,05		0,07806		
		vodorovná : 1,63*42*0,000888*1,05		0,06383		
		podbetonování základů zdiva :				
		svislá : 1,58*24*0,000888*1,05		0,03536		
		vodorovná : 2,4*28*0,000888*1,05		0,06266		
22	631312511RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	0,20538	3 149,25	646,79
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění				
		podkladní beton : 2,52*1,63*0,05		0,20538		
23	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,18374	3 453,25	634,87
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění				
		skladba 3 : 1,67*1,63*0,05+0,085*2		0,18374		
24	763896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x	m2	2,72210	60,98	165,91
		skladba 3 : 1,67*1,63		2,72210		
25	900 RT1	HZS - práce spojené s podbetonováním základů - postupné bednění po 0,5m	h	25,00000	347,65	8 691,25
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-2 572,92
26	317121044RU1	Překlad nosný pórobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný NOP III / 4 / 22 149 x 24,9 x 30 cm	kus	-1,00000	2 137,68	-2 137,68
		P7 - 1		-1,00000		
27	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	-0,01206	7 447,18	-89,81
		P5 : -1,6*2*0,00377		-0,01206		
28	133301510000R	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm 11375	kg	-12,86720	27,27	-345,43
		P5 : -1,6*2*3,77*1,05		-12,86720		
Díl: 5		Komunikace				6 083,55
29	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrku	m3	1,58100	903,55	1 428,51
		dní V5 : 0,6*0,4*1,55		0,37200		
		chodník : (1,4*2,7+1,2*1,2*2)*0,15		1,20900		
30	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam do 4 cm	m2	3,16650	367,63	1 164,10
		odvod poklopu - skladba 1 : 2,26*2,1+0,72*0,45*2		3,16650		
		1,35*1,65				
31	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 4 cm	m2	9,00600	236,73	2 131,99
		použitá vybouraná dlažba - skladba 5 : 4,0*3,6*2,26*2,1		9,00600		
		0,72*0,45*2				
32	58360058R	Mozaika dlažební 6/8 štipaná 1t = 6,5 m2 čedičové kostky	m2	3,48315	390,15	1 358,95

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL041 Stavební část - odpadní výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3,1665*1,1		3,48315		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					3 520,00
33	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	4,00000	880,00	3 520,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					66 285,40
34	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,32430	13 168,50	4 269,90
		drážky pro HEB				
		4,7*0,3*0,115*2		0,32430		
35	961031411R00	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,75000	936,00	701,25
		Stěna 1 PP : 0,2*1,5*2,5		0,75000		
36	964076211R00	Vybourání nosníků ze zdi betonové dl. 4 m, 10 kg/m	t	0,16000	15 861,00	2 537,76
		stávající zastřešení : 0,16		0,16000		
37	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	0,50000	701,99	351,00
		(0,1+0,15)*2		0,50000		
38	970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	1,30000	1 438,80	1 898,18
		prostory žb stěnou : (0,5+0,15)*2		1,30000		
39	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm	m	1,80000	1 738,25	3 128,85
		prostory žb stěnou : (0,3+0,15+0,3+0,15)*2		1,80000		
40	971033331R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 0,09 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,00000	75,31	75,31
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
41	971042241R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	1,00000	311,95	311,95
42	971042341R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl. do 30cm	kus	3,00000	513,40	1 540,20
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)				
43	965R01	Vybourání stávající podpěrné konstrukce	kompl	1,00000	15 800,00	15 800,00
44	965RR	Vybourání stávající žb šachty DPr-B vč poklopu	ks	1,00000	850,00	850,00
45	966R	Odstranění stávající kanalizační stupačky vč zaslepení	soubor	1,00000	5 145,00	5 145,00
46	967R	Vybourání trapezového plechu zastřešení světlíku	m2	7,81000	3 800,00	29 678,00
		3,7*1,3+2,5*1,2		7,81000		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					96 152,52
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	138,12040	696,15	96 152,52
Díl: 711	Izolace proti vodě					63 140,62
48	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svisl. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	45,07000	41,65	1 877,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 - 45,07000		45,07000		
49	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svisl. pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	45,07000	303,03	13 657,56
		2,5*3*0,8+0,2*2,5+0,4*2,5*2		8,50000		
		6*5,3*1,15		36,57000		
50	711172559R00	Izolace proti vlhkosti svisl. fólii, volně	m2	31,80000	172,98	5 500,76
		ropová fólie : 6,0*5,3		31,80000		
51	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	6,00000	292,40	1 754,40
		nátěr trapezového plechu : 6,0		6,00000		
52	711212005RT4	Hydroizolační povlak - cementová stěrka včetně penetrace proti vlhkosti, tl. 2 mm	m2	18,50700	996,20	18 436,67
		dvouvrstvá				
		stěny šachty nad ukončením fólie : (1,63+2,17*2)*3,1		18,50700		
53	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4 582,04600	3,78	17 320,14
54	28323135R	Folie ropová nopy 20mm	m2	34,98000	131,33	4 593,92
		6,0*5,3*1,1		34,98000		
Díl: 712	Povlakové krytiny					13 891,10

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL041 Stavební část - odpadní výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
55	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k fólii včetně dodávky lišty dno : (2,42+1,63)*2	m	8,10000	135,58	1 098,20
56	712361703RT1	Povlaková krytina do 10°, fólie lepenou 1 vrstvou - fólie ve specifikaci dno : (2,42*1,63+0,39*1,63) stěny : ((1,42+0,25)*2+1,63)*1,4+(0,5*2+1,63)*1,675	m2	16,46955	300,48	4 948,77
57	098712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 036,64900	3,40	3 524,81
58	283220012R	Fólie izolační tl. 1,5 mm s protiskluznou úpravou PVC-P s PES vyztuží, ředě 16,46955*1,1	m2	18,11651	239,43	4 319,52
				18,11651		

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 57 780,00

59	286R02	Napojení kabelu, vč. jističe - spínač, plovák	kompl.	1,00000	12 500,00	12 500,00
60	Mimo RTS	Ponorné čerpadlo, pro čerpání z jímky vč. hadice a sávkového připojení	ks	1,00000	45 280,00	45 280,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 267 628,89

61	953981204R00	Chemické kotvy, beton, hl. 125 mm, M16, malta 2slož	kus	38,00000	161,08	5 798,88
62	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg dle výpisu materiálu : 2221,57	kg	2 221,57000	94,51	210 027,23
				2 221,57000		

63	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	2,37646	1 283,50	3 050,19
64	7662001015TT	T15 Dveře ocelové vnitř vč. zárubně dvoukřídlé 1400x2250 dod. + mont., specifikace dle výpisu	kus	-1,00000	63 448,29	-63 448,29
65	767R_01	Výroba atypické konstrukce pro nájezd kontejneru	ks	1,00000	26 901,19	26 901,19
66	13231028R	Úhelník rovnoramenný L, jakost S235 30x30x3 mm 11375 0,01184*1,05	t	0,01243	34 408,00	427,69
				0,01243		

67	13388425R	Týč průřezu HEB100, střední, jakost oceli S235 11375 0,816*1,05	t	0,85680	33 515,50	28 716,08
				0,85680		

68	13487115R	Týč průřezu HEB 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 1,1647*1,05	t	1,22294	33 908,90	41 465,62
				1,22294		

69	13611226R	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm 0,01256*1,05	t	0,01319	38 202,50	505,08
				0,01319		

70	13611238R	Plech hladký jakost S235 15x1000x2000 mm 0,01758*1,05	t	0,01846	39 833,00	737,16
				0,01846		

71	1364071R	Ocelový porořost 0,0565*1,1	t	0,07315	143 781,75	10 517,64
				0,07315		

72	15484123R	Profil trapezový Aluzink 6,0*1,1	m2	6,60000	443,79	2 928,42
				6,60000		

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 3 458,21

73	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,14815	133,43	687,02
74	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku	t	5,14815	95,71	482,73

75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,81477	8,68	853,40
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,14815	133,92	689,44

77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,14815	14,93	76,86
78	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,14815	166,81	858,76

Díl: ON Ostatní náklady 222 080,00


79	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	23 500,00	23 500,00
----	------------	---	--------	---------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL041 Stavební část - odpadní výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	R33M	Dokončovací práce-fešení detailů souvisejících s montáží výtahu	soubor	1,00000	38 910,00	38 910,00
81	R01	Přeložka zařízení DPMB, včetně revize, včetně uchycení kabelů uvnitř objektu do oz žlabů bez revize	soubor	1,00000	10 520,00	10 520,00
82	R02	Přeložka zařízení Cetin, včetně revize bez revize	soubor	1,00000	58 900,00	58 900,00
83	R03	DMT a zabezpečení stávajícího kabelu VN	kompl	1,00000	9 690,00	9 690,00
84	R05	Podepření a zajištění stávajícího potrubí	kompl	1,00000	15 980,00	15 980,00
85	R06	Přemostění - pochůzní část pro veřejnost vč. zabezpečení jámy, po dobu otevřeného výkopu Lávka - přemostění jámy : 1 rozměry lávky: 6*1,3m výška zábradlí do 2m	kompl	1,00000	64 580,00	64 580,00

Celkem	1 050 914,32
---------------	---------------------

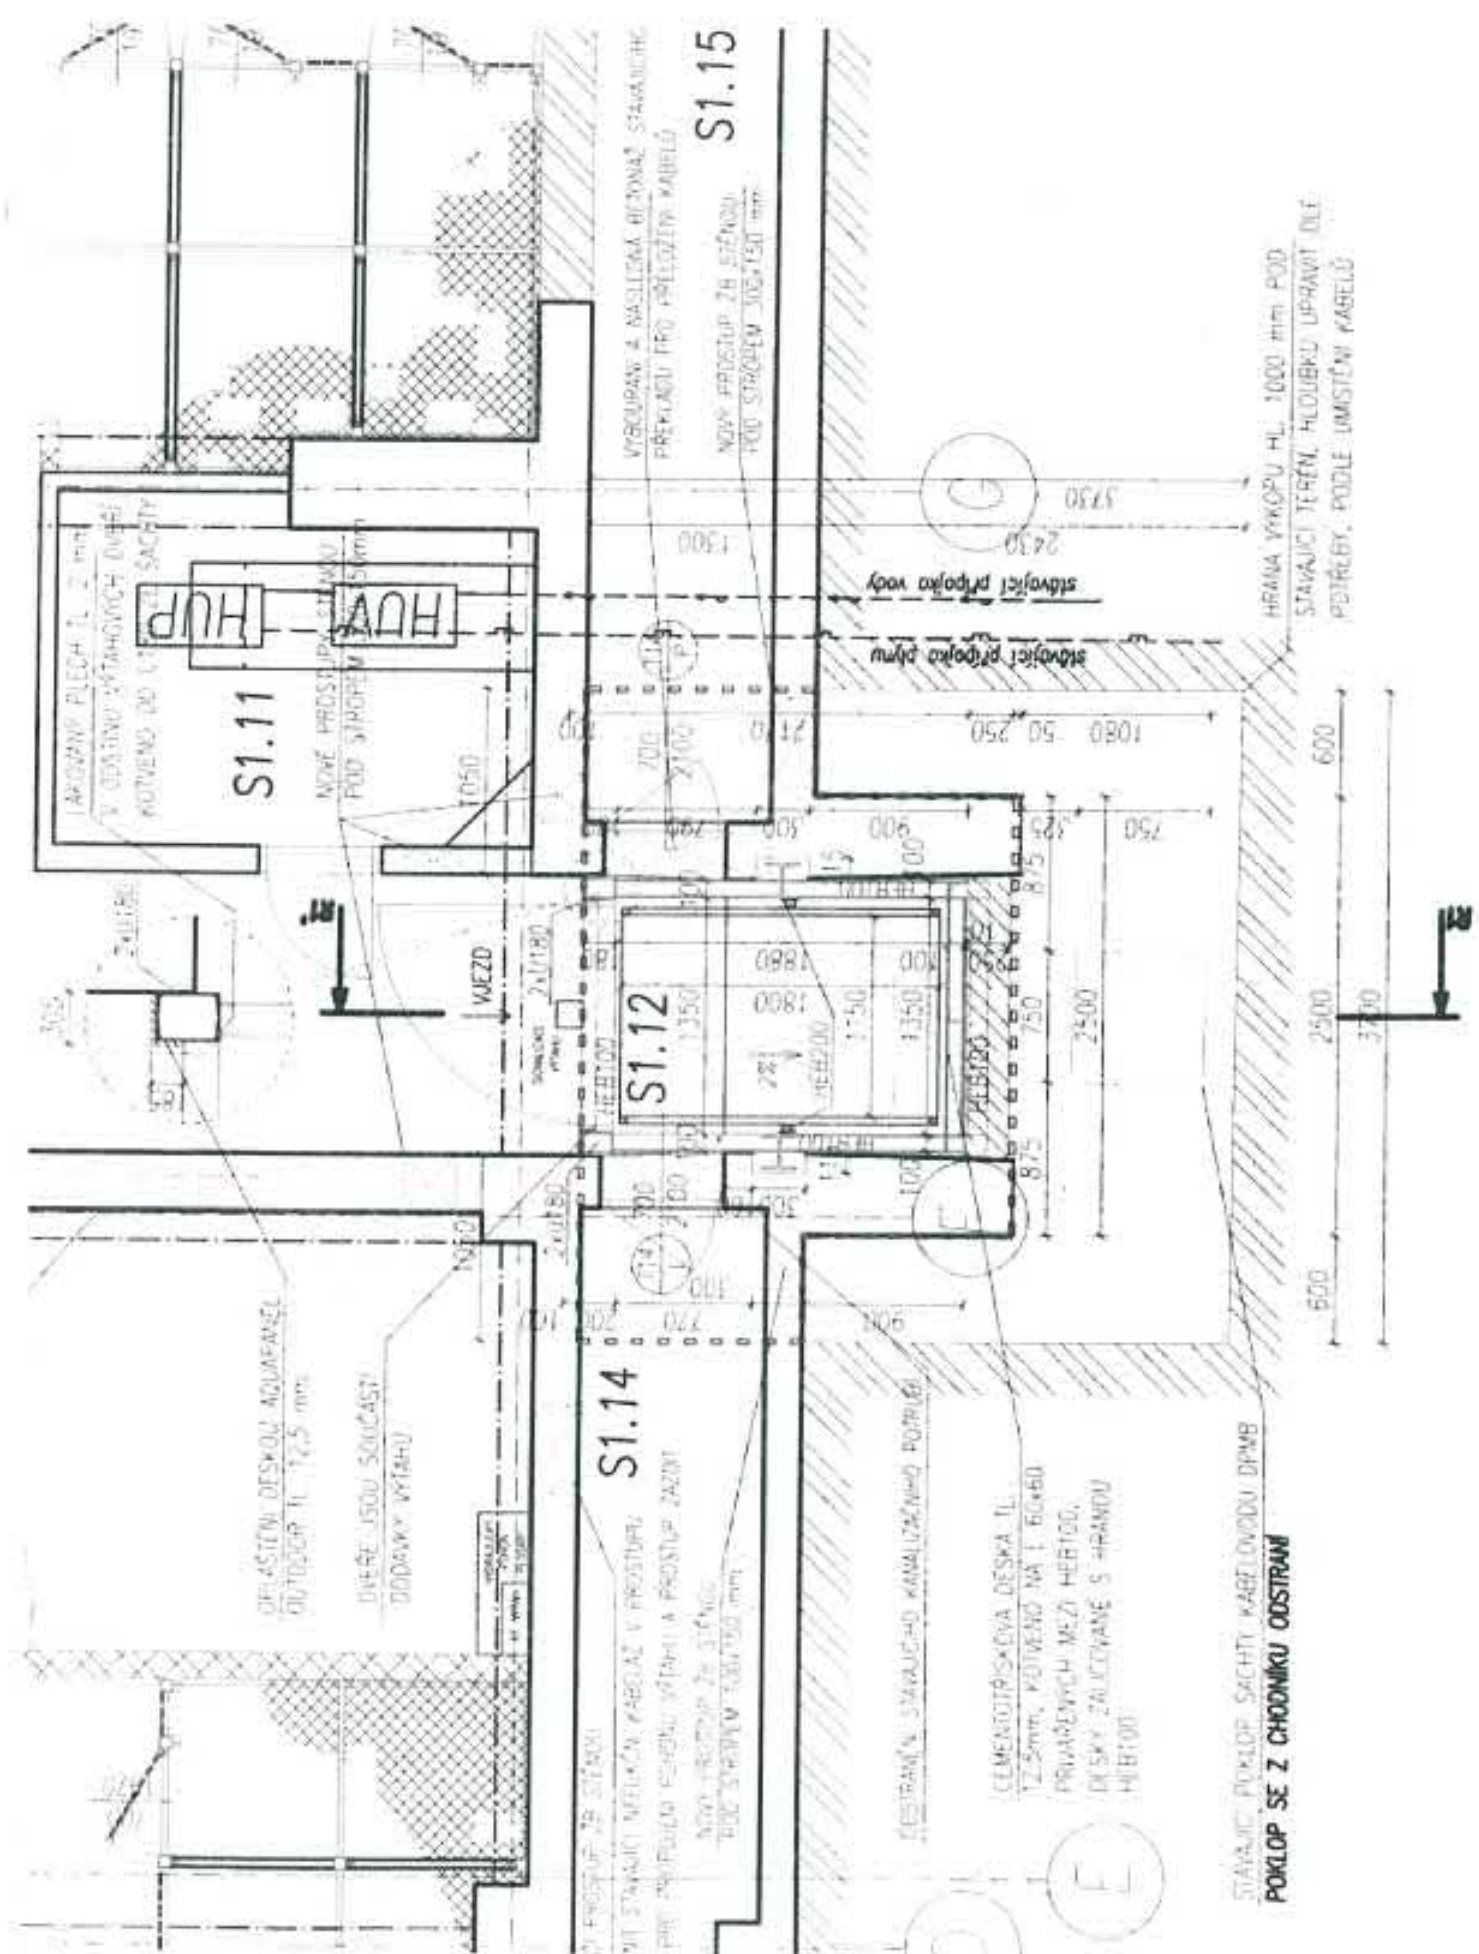

LARGOVÝ PLECH TL 2 mm
V ODSÁDNĚ SÍTAČOVÝCH DVB
KOTVENO DO LÍŽNÍ SACHTY

S1.11

HUP

NOVÉ PROSTUPNÉ STĚNY
POD SÍTEM 1500 mm

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

S1.12

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

S1.14

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

S1.15

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

S1.16

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

S1.17

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

S1.18

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

HVP

SKLADEB

VŠ SKLADEB

REKONSTRUČNÍ PRÁCE POKLADY

ČESKÝ VÝSTAV
LOŽE Z OSL. 10-4,5 60 mm
40-60 mm

INDUKČNÍ VÝSTAVNÍ POKLADY
DOPROJEKT VÝSTAVNÍ POKLADY
KONSTRUKCE VÝSTAVNÍ POKLADY

MAJÍ SKLADEB

REKONSTRUČNÍ PRÁCE POKLADY

T. ZAM. DLAŽBA 60 mm
ZE Z. DR. 10-4,5 40 mm
ČESKÝ VÝSTAV 150 mm
MINI

VŠ SKLADEB

REKONSTRUČNÍ PRÁCE POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU 2,4 mm
BETONOVÝ VÝSTAVNÍ POKLADY S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU 50-80 mm

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY


POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

POCHOZÍ VÝSTAVNÍ POKLADY

VÝPIS MATERIÁLŮ

POL.	POPIS	DĚLKA m	POČET ks	CELKOVÁ DĚLKA m	HMOTNOST kg/m (kg/ks)	HMOTNOST kg
A	HEB 100			40,00	20 400	816,00
B	HEB 200	3,825	2	7,65	61 300	468,95
C	U 180	3,825	4	15,30	22 000	336,60
C	JEKL 70x50x3			6,9000	5 040	34,78
C	U 50x50x3			6,9000	3 300	22,77
C	PLECH P14	0,053	2	0,11	109 900	11,65
C	PLECH P14	0,040	2	0,08	109 900	8,79
D	PLECH P10	0,040	4	0,16	78 500	12,56
E	TRAPEZOVÝ PLECH			6,00m ²	11 280	67,68
F	OCELOVÝ PORDROŠT			1,90m ²	35 000	66,50
G	L 30x30x3		10	8,70	1 360	11,84
G	L 60x60x5			17,90	4 570	81,81
H	KOTVY NAPR. HAS M16		32			
	SPOJE (3%)					58,10
CELKOVÁ HMOTNOST kg						1998,12

VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY BUDOU UPATŘENÉ ANTIKOROZIVNÍ NÁTEREM



OPRAVA NÁDRAŽNÍ DLE SCHVÁLENÉ VÝSTAVY
03/2022

±0,000 = POOLARA I.NP



ZHOTVITEL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
KONTROLOVAL
VYPRACOVAL
INVESTOR

ATELIER SYNOPIA Č. 35, 612 00 BRNO
ING. ARCH. MICHAL KRÁTEK
ING. ARCH. MICHAL KRÁTEK
ING. ARCH. MICHAL KRÁTEK
ING. VLADIMÍR PETRÁŠ
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, M. Č. BRNO - STŘED

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
parc. č. 289, k.ú. BRNO - MĚSTO

STUPĚŇ PROJEKTU
ZNAČKOVÉ ČÍSLO
DATA

290
M16_407
10/2021

NAVROVANÝ STAV
ŘEZ VÝTAHEM NA VÝVOZ ODPADŮ R1-R1'

DETAIL


MĚŘÍTKO
ČÍSLO VÝKRESU


M 1:50
SO 01.OOP-03

PROJEKT KONSTRUKCE ZÁMĚRIT
NA ZÁKLADĚ DODAVATELE VÝTAHU
I. SOUŘEZNÍ I. KONSTRUKCE POKLADY

STAVBA SÍTĚ, RUČNĚ

STAVBA
I. STĚNY S PŘESAHEM 100 mm, DLAŽBA
BETONOVÝ STĚNA (1) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (2) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (3) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (4) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (5) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (6) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (7) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (8) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (9) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (10) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (11) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (12) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (13) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (14) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (15) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (16) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (17) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (18) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (19) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (20) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (21) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (22) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (23) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (24) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (25) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (26) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (27) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (28) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (29) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (30) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (31) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (32) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (33) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (34) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (35) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (36) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (37) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (38) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (39) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (40) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (41) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (42) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (43) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (44) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (45) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (46) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (47) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (48) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (49) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (50) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (51) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (52) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (53) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (54) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (55) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (56) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (57) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (58) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (59) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (60) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (61) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (62) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (63) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (64) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (65) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (66) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (67) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (68) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (69) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (70) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (71) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (72) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (73) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (74) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (75) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (76) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (77) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (78) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (79) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (80) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (81) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (82) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (83) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (84) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (85) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (86) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (87) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (88) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (89) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (90) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (91) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (92) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (93) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (94) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (95) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (96) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (97) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (98) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (99) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (100) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (101) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (102) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (103) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (104) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (105) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (106) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (107) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (108) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (109) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (110) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (111) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (112) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (113) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (114) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (115) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (116) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (117) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (118) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (119) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (120) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (121) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (122) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (123) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (124) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (125) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (126) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (127) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (128) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (129) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (130) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (131) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (132) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (133) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (134) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (135) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (136) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (137) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (138) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (139) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (140) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (141) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (142) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (143) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (144) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (145) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (146) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (147) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (148) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (149) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (150) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (151) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (152) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (153) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (154) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (155) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (156) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (157) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (158) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (159) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (160) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (161) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (162) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (163) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (164) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (165) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (166) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (167) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (168) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (169) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (170) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (171) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (172) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (173) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (174) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (175) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (176) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (177) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (178) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (179) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (180) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (181) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (182) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (183) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (184) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (185) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (186) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (187) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (188) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (189) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (190) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (191) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (192) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (193) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (194) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (195) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (196) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (197) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (198) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (199) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (200) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (201) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (202) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (203) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (204) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (205) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (206) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (207) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (208) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (209) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (210) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (211) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (212) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (213) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (214) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (215) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (216) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (217) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (218) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (219) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (220) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (221) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (222) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (223) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (224) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (225) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (226) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (227) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (228) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (229) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (230) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (231) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (232) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (233) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (234) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (235) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (236) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (237) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (238) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (239) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (240) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (241) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (242) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (243) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (244) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (245) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (246) 250 mm Z BETONU C25/30-AC2
I. STĚNA (247) 250 mm Z BETONU C25



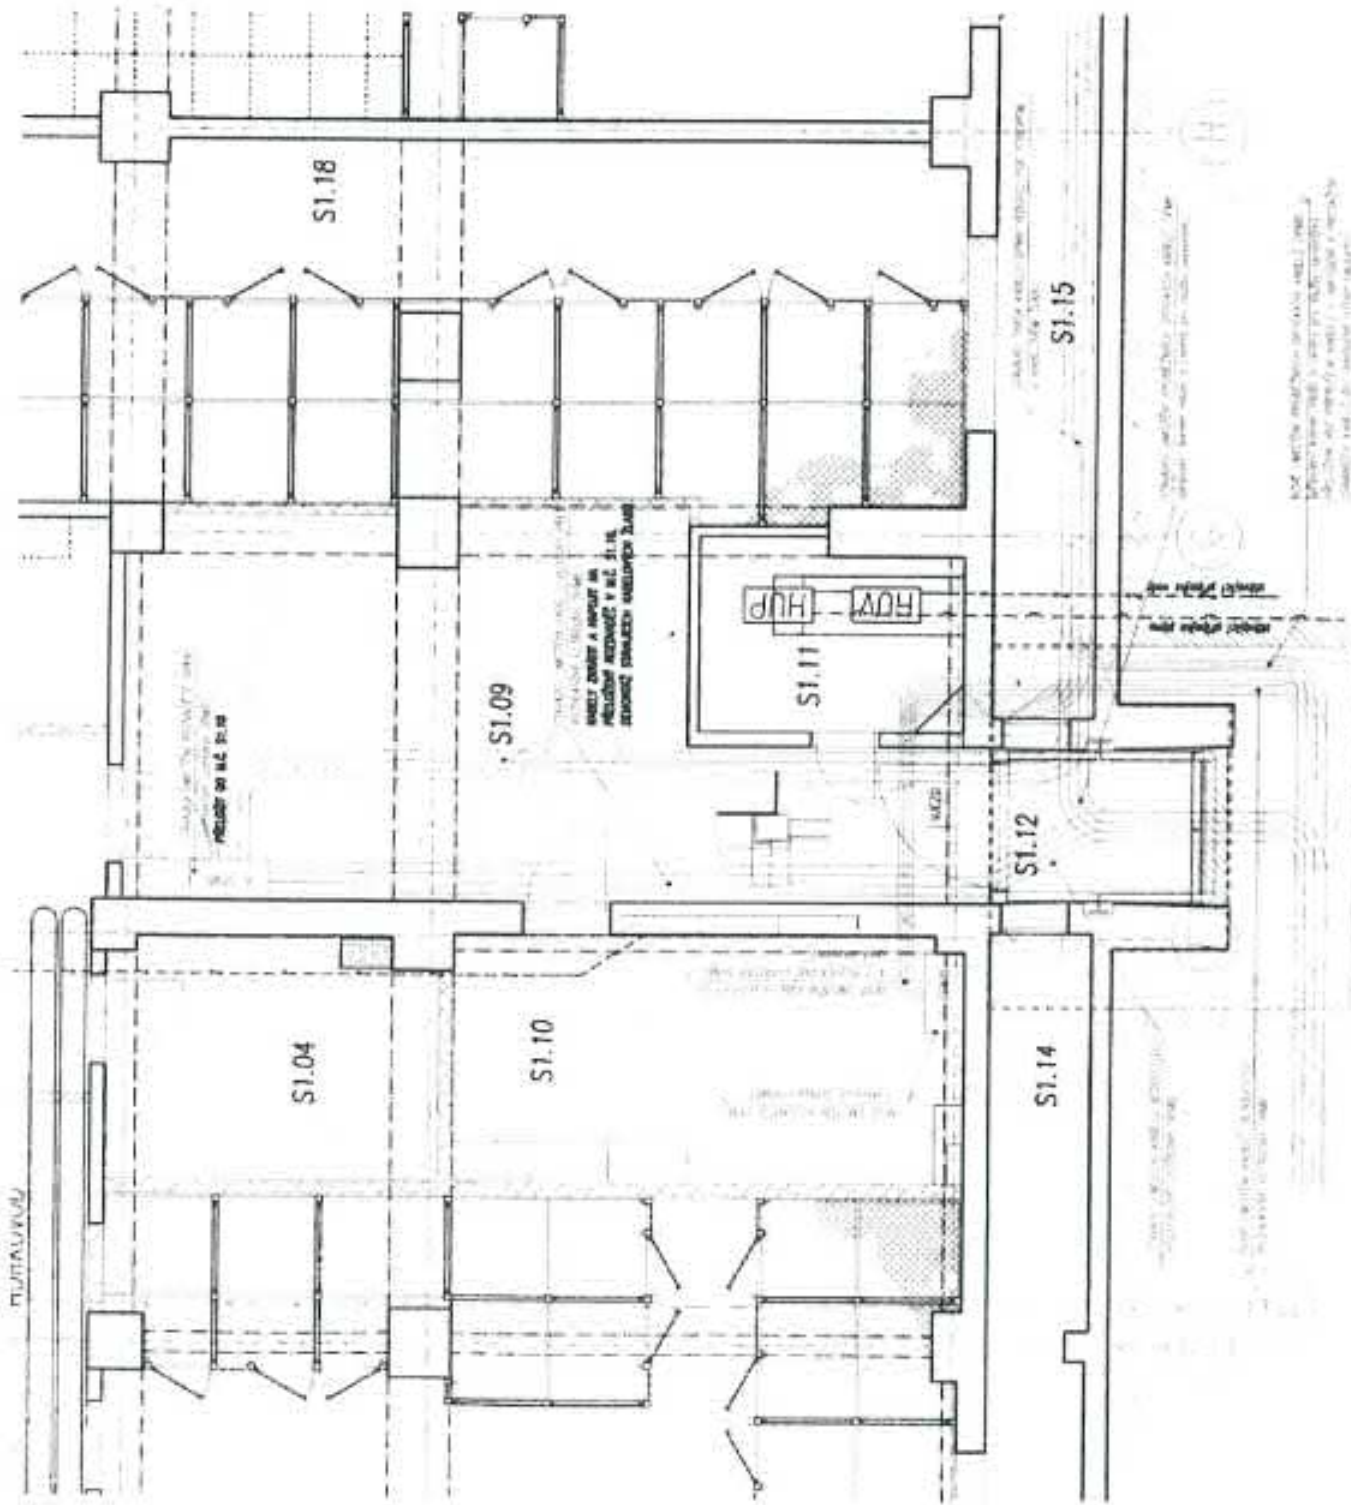

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  KABELOVÝ TRÁS
-  KABELOVÝ TRÁS
-  KABELOVÝ TRÁS
-  KABELOVÝ TRÁS


LEGENDA STŘÍ

-  KABELOVÝ TRÁS
-  KABELOVÝ TRÁS

POZNÁMKA

KABELY V KOTVENOSTECH S1.09, S1.10, S1.11, S1.15 BUDOU ULOŽENÉ DO NOVÝCH PŘEDKOVÝCH ŽLABOVÝCH KOTVENÝCH DO STŘEŠNÍ

1:1000 = PLOŠNÁ LHP



PROJEKT:
OBJEKT: PŘEDKOVÝ
PROJEKT: PŘEDKOVÝ
KOTVENÝ
PŘEDKOVÝ
PŘEDKOVÝ

AKCE: SMONTÁŽ ŽLABŮ A KOTVENÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH

OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
PAR. 6. 200. K. 6. 690 - MĚSTO

STAVBA PŘEDKOVÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH

STAVBA PŘEDKOVÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH

NAVRHOVATEL STAV
PŘEDKOVÝCH KOTVENÝCH

STAVBA PŘEDKOVÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH

STAVBA PŘEDKOVÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH

STAVBA PŘEDKOVÝCH
KOTVENÝCH
KOTVENÝCH

Protokol o změně díla

Změnový list č. 42

Předmět díla:	Oprava objektu Nádraží 4, Brno		
Objekt:	Nádraží 4, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny: Na základě požadavku investora nebude realizována dodávka a montáž kuchyňské linky S37 dle původního umístění v m.č. S1 19 (suterén 1.PP), s ohledem na změnu využití prostor			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	☒
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☐
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut. provedení	☒	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.3 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		-19 579,25 Kč -0,03%
	Výše DPH sazba:	15%	-4 111,64 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-23 690,89 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		73 585 066,75 Kč
	Součet přechozích ZL 1-41 (bez DPH)		2 518 759,06 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH		76 084 246,56 Kč
	Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH		87 496 883,54 Kč
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-19 579,25 Kč	-0,03%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	-19 579,25 Kč	-0,03%
termín	Termín realizace změny:	02.03.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]
	Zhotovitel (stat. zástupce)	01.04. 2022	[REDACTED]
	Zhotovitel (slavbyvedouc)	01.04. 2022	[REDACTED]
	TDI:	1.4. 2022	[REDACTED]
	Proje:	1.4. 2022	[REDACTED]
	Objednatel (stat. zástupce)		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.042 - Kuchyňská linka - méněpráce		
	Výkresová část - Kuchyňská linka (položka S34), Půdorys 1.PP (suterén m.č. S1 19)		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **STL180730**
1 **OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4**

Objekt: **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL042** **Kuchyňská linka S 34 - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírkova 982/4, DIČ: **CZ60838744**
15800 Praha 5 - Jinonice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-19 579,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-19 579,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-19 579,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -19 579,25 CZK

v Brně dne 01.04.2022



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
790	Vnitřní vybavení	PSV			-19 579,25	100
Cena celkem					-19 579,25	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL042 Kuchyňská linka S 34 - méněpráce


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 790		Vnitřní vybavení				-19 579,25
1	790100034	S34 Kuchyňská linka, specifikace dle PD	kus	-1,00000	19 579,25	-19 579,25
Celkem						-19 579,25

POLOŽKA S 34 **KUCHYŇSKÁ LINKA M.Č. S1.19**


PŮDORYS



POHLED

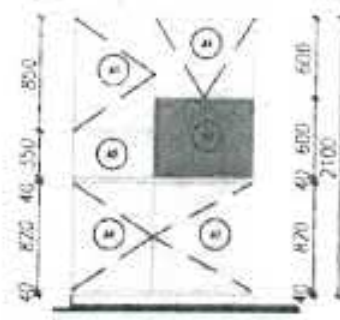

- A1** KUCHYŇSKÁ LINKA
 SPODNÍ ČÁST LINKY - PLNĚ HLADKÉ DVĚŘKA BARVY RAL 9010
 PRACOVNÍ DESKA TL. 40 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINO
 EGGER HI180 SE37 REPRO, DUB HALIFAX PŘÍRODNÍ
 VRCHNÍ ČÁST LINKY - PROSKLENÉ DVĚŘKA BARVY RAL 9010,
 MLÉČNĚ PROSKLENÍ
- A2** ČELNÍ DESKA KUCHYŇSKÉ LINKY TL. 40 mm - POVRCHOVÁ
 ÚPRAVA LAMINO EGGER HI180 SE37 REPRO, DUB HALIFAX
 PŘÍRODNÍ
- A4** VESTAVĚNÁ JEDNICE
 PARAMETRY 1 SKLENĚNÉ POLICE VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ,
 2 PŘEHRAZKY NA DVĚŘKÁCH, SPOTŘEBA ENERGIE 0,55 kWh/24h,
 HLUČNOST 40 dB, KLIMATIZAČNÍ TŘÍDA SE, SV. A, BARVA ČERNÁ
- A5** VESTAVĚNÁ MRAŽIČKA POUŽITA
 PARAMETRY VYTRVĚLÝ OSVĚTLENÍ BARVA ČERNÁ, SYSTÉM
 TEPLOTNĚ ÚPRAVY MRAŽIČKY/SMR. KŘÍŽEN 1450 W,
 MRAŽIČKOVÝ VÝKON 302 K, VÝKON ČERNOU 1000 W

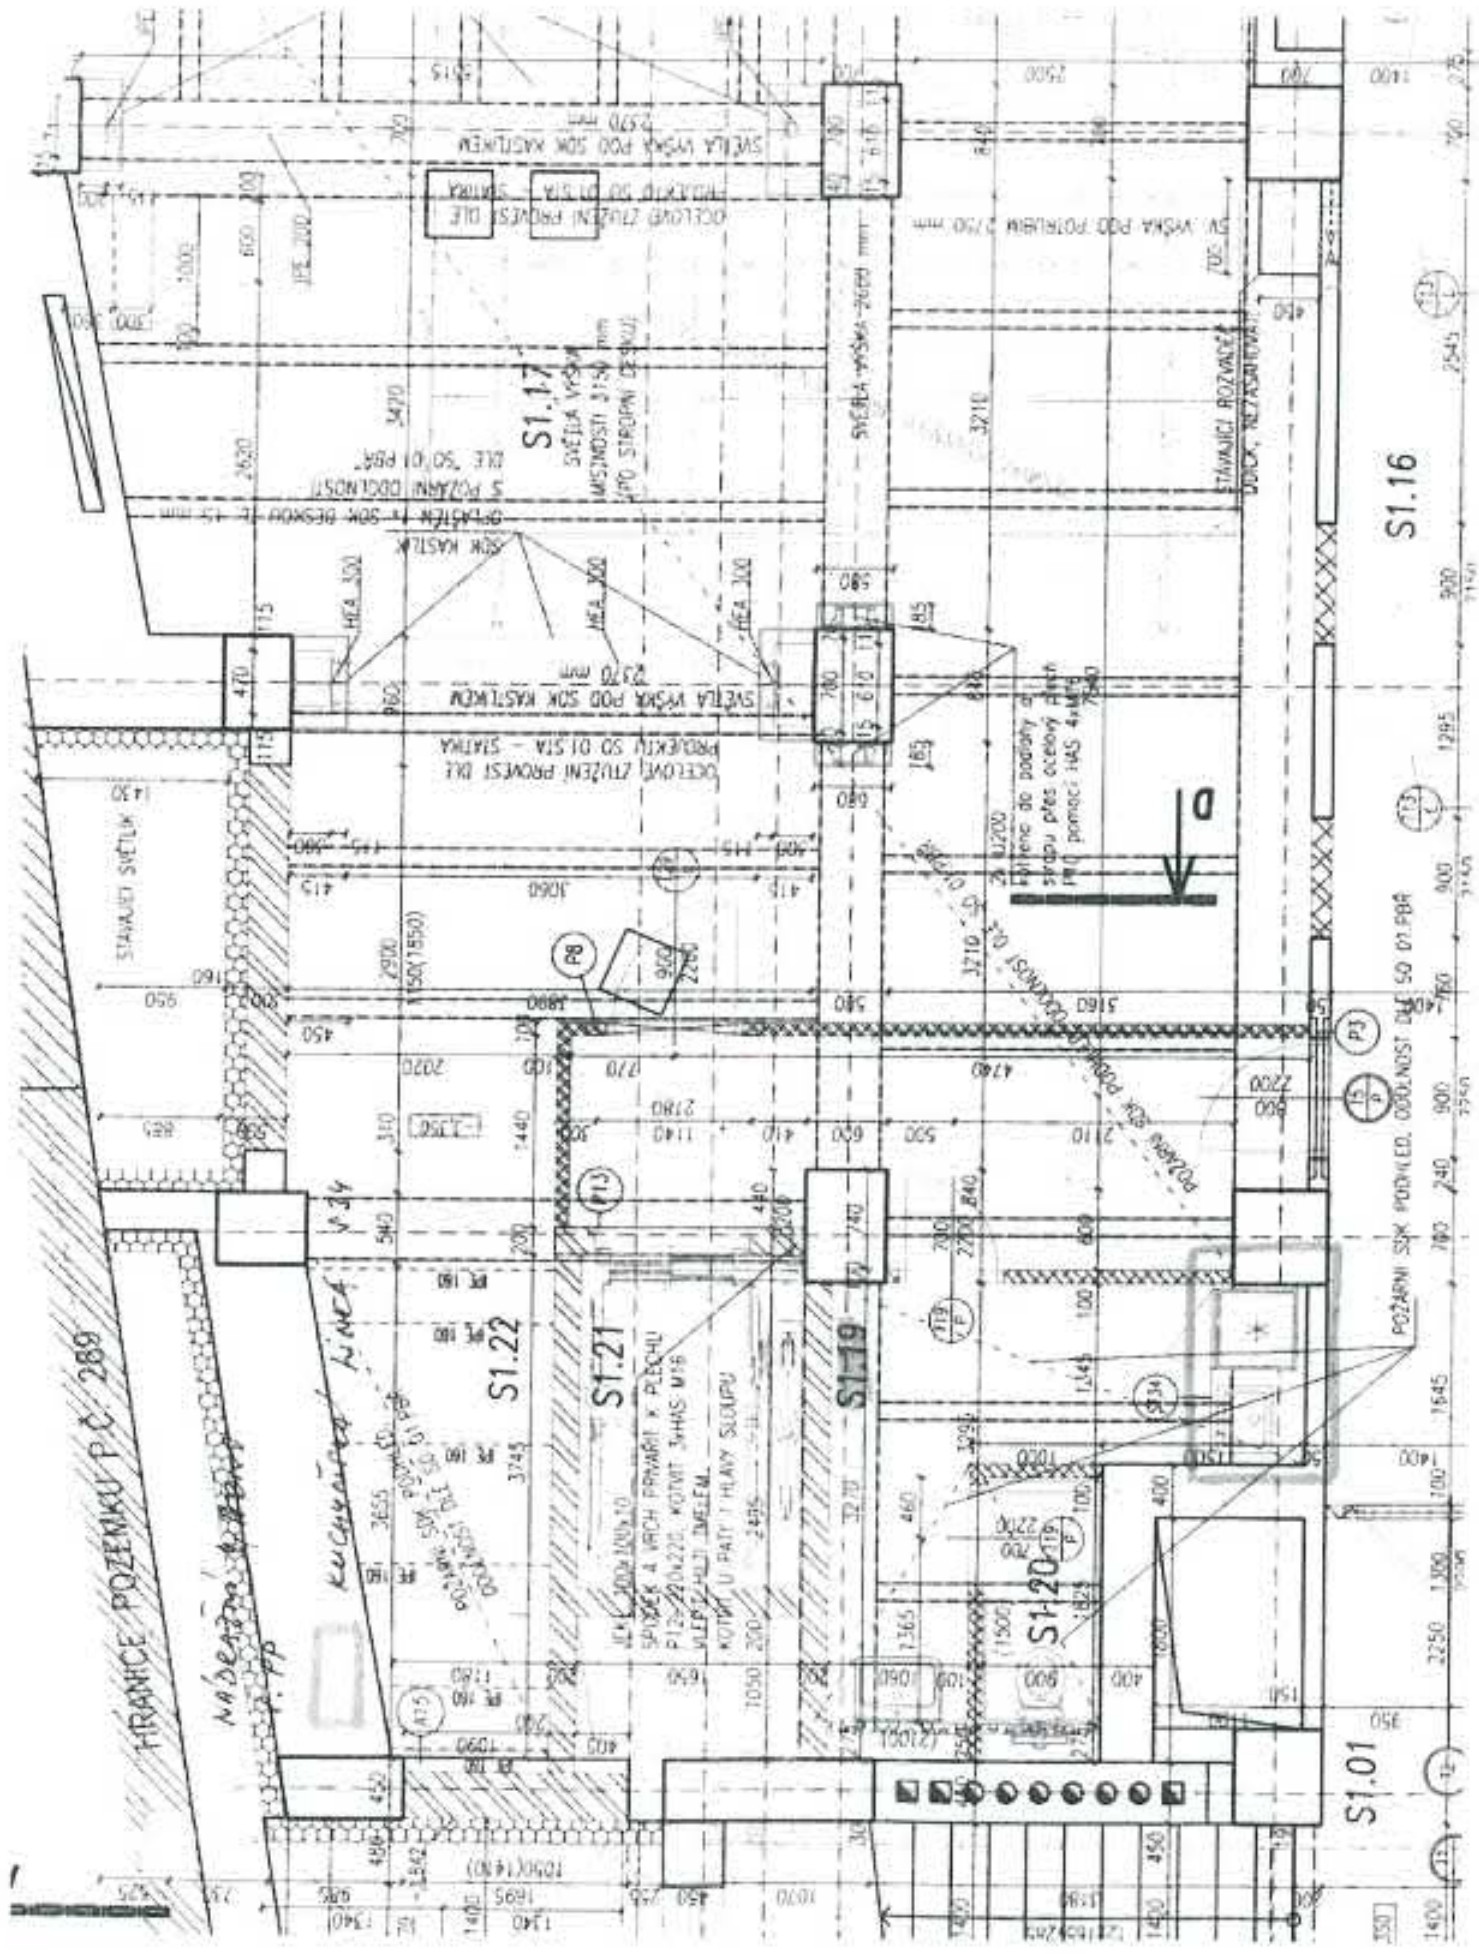

Protokol o změně díla

Změnový list č. 43

Předmět díla	Oprava objektu Nádražní 4, Brno			
Objekt	Nádražní 4, Brno			
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
Zhotovitel	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 156 00 Praha 5, IČ: 60838744			
TDI	[REDACTED]			
Projektant	[REDACTED]			
Popis změny:				
Stavba „Oprava objektu Nádražní 4“ zahrnuje instalaci nových osobních výtahů na levé i pravé straně budovy Nádražní 4. Ve výtah. šachtách jsou doplněny překledy. Pro jejich osazení bylo nutné vybourat větší otvor, a tedy došlo k zásahu do teracové podlahy i kamenných obkládů. Po dohodě s investorem dojde k vyřezání původního dílce teracové podlahy vždy před vstupem do výtahu a nahradí se vyřezávaným dílcem, vč. zaskapování spoje a začištění hran. Kamenný obklad na stěnách bude nutné řezat na místě a hrany zapravit, případně jednotlivé kusy doplnit novými. Dále při výměně původních bytových dveří se zárubněmi 1000/1970 za nové 500/2100, vznikla mezera u ozdobného vodorovného kamenného pásu a soklu ve spodní části dveří. Po dohodě s investorem se doplní vodorovný pás ve v. 1,5m a podlahový sokl z přírodního kamene až k novým zárubním.				
údaje o změně	Změnu vyvolal	zhotovitel		
	Jedná se o změnu (zaškrtnout)	☒ zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla ☐ úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla ☐ § 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☐ ☒ ☐	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout)	☐ zápis do SD (deníku změn) ☐ doplatek k PD ☐ dokumentace skut. provedení ☐ jiné	☐ ☐ ☒ ☐	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č. 3 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	98 495,61 Kč	0,13%	
	Výše DPH sazba: 15%	14 774,34 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	113 269,95 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	73 585 066,75 Kč		
	Součet přechozích ZL 1-42 (bez DPH)	2 499 179,81 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	76 182 742,17 Kč		
Cena díla dle dodatku č. 3 vč. DPH	87 610 153,50 Kč			
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%	
	Vícepráce celkem bez DPH	98 495,61 Kč	0,13%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 3	98 495,61 Kč	0,13%	
termín	Termín realizace změny	03.04.2022		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	[REDACTED]		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDACTED]	
	Zhotovitel (stat. zástupce)	11.04.2022		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí)	11.04.2022		
	TDI	7.4.2022		
	Proj.	7.4.2022		
	Objednatel (stat. zástupce)			
přílohy	Přílohy			
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 043 - Prvky z přírodního kamene doplnění Fotodokumentace ke ZL043 - Osobní výtah 1.NP a 2.NP, Bytové dveře 5.NP			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: STL180730 1 OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4

Objekt: Změnové listy

Rozpočet: ZL043 Prvky z přírodního kamene doplnění

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744
 Kačírkova 982/4, DIČ: CZ60838744
 15800 Praha 5 - Jinonice

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 836,58
PSV			87 659,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 495,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	98 495,61 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 98 495,61 CZK

v BRNE dne 01.04.2022

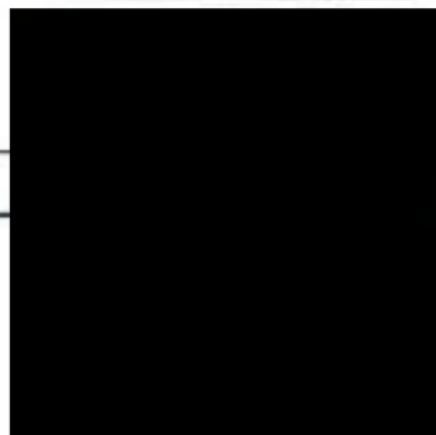

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 207,95	10
773	Podlahy teracové	PSV			5 068,28	5
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			82 590,75	84
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			628,63	1
Cena celkem					98 495,61	100

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL043 Prvky z přírodního kamene doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 207,95
1	965043341R00	Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	0,17550	1 387,02	243,58
		5,85*0,03		0,17550		
2	965081813RT2	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	5,85000	36,71	214,75
		Levá strana:				
		1.NP práh : 0,25*1,2		0,30000		
		2.NP - 8.NP práh : (0,25*1,5)*7		2,62500		
		Prává strana:				
		1.NP práh : 0,25*1,2		0,30000		
		2.NP - 8.NP práh : (0,25*1,5)*7		2,62500		
3	781111112R00	Řezání hran - kamenický řez	m	24,80000	383,13	9 749,62
		0,5*2+2*2+2*1,1+0,25+0,15+1,1*2+2*0,3+0,2+0,1+1,0+0,4+0,5+0,5+0,2		18,30000		
		0,07*10+0,2*10		2,70000		
		1,5*2+0,8		3,80000		
Díl: 773		Podlahy teracové				5 068,28
4	773894000R00	Řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	31,80000	159,38	5 068,28
		Levá strana:				
		1.NP práh : 0,2+0,2+1,2		1,60000		
		2.NP - 8.NP práh : (0,2+0,2+1,5)*7		13,30000		
		Prává strana:				
		1.NP práh : 0,2+0,2+1,2		1,60000		
		2.NP - 8.NP práh : (0,2+0,2+1,5)*7		13,30000		
		Dveře 3.NP L+P strana : 1,0+1,0		2,00000		
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				82 590,75
5	782131140R00	Obklad stěn a prahů kamenem tvrdým, rovným tl. 2,5 a 3 cm montáž	m ²	13,59200	1 653,25	22 470,97
		dveře vstupní bytové : 53*((0,1*2*0,07)+(0,2*0,1*2))		2,86200		
		stěna u PHP : 1*0,4*1,5		0,60000		
		sokl u dveří a vytahů : 8*0,2*0,2		0,32000		
		vytahy : 4*((1+2)*0,1)		2,00000		
		nad vytahem : 1.NP levá strana : 0,8*1,1		0,88000		
		(0,7*1,5)+(1,15*0,85)		2,02750		
		vytah 1.NP pravá strana : (0,1*2)+(0,15*0,15)		0,22250		
		Levá strana:				
		1.NP práh : 0,2*1,2		0,24000		
		2.NP - 8.NP práh : (0,2*1,5)*7		2,10000		
		Prává strana:				
		1.NP práh : 0,2*1,2		0,24000		
		2.NP - 8.NP práh : (0,2*1,5)*7		2,10000		
6	622450004RR	Doprava materiálu pro obklad a prahy	kompl	1,00000	4 500,00	4 500,00
7	5838218R1R	Deska obkladová leštěná tl.2,5 a 3cm	m ²	14,82620	3 692,23	54 741,74
		Přesná specifikace materiálu dle TZ				
		dveře vstupní bytové : 53*((0,1*2*0,07)+(0,2*0,1*2))		3,14820		
		stěna u PHP : 1*0,4*1,5		0,60000		
		sokl u dveří a vytahů : 8*0,2*0,2		0,32000		
		vytahy : 4*((1+2)*0,1)*1,1		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	OPRAVA OBJEKTU NÁDRAŽNÍ 4
O:	Změnové listy
R:	ZL043 Prvky z přírodního kamene doplnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nad výtahem 1.NP levá strana : $0,8^{*}1,1^{*}1$		0,96800		
		$(0,7^{*}1,5)+(1,15^{*}0,85)^{*}1,1$		2,12525		
		výtah 1.NP pravá strana : $(0,1^{*}2)+(0,15^{*}0,15)^{*}1,1$		0,22475		
		Levá strana :				
		1.NP práh : $0,2^{*}1,2^{*}1,1$		0,26400		
		2.NP - 8.NP práh : $(0,2^{*}1,5)^{*}7^{*}1,1$		2,31000		
		Pravá strana :				
		1.NP práh : $0,2^{*}1,2^{*}1,1$		0,26400		
		2.NP - 8.NP práh : $(0,2^{*}1,5)^{*}7^{*}1,1$		2,31000		
8	58582139R	weberfor duoflex lepicí tmel na obklady a dlažby přírodní šedá	kg	54,36800	16,15	878,04
		4 kg na m ² : $1,3,592^{*}4$		54,36800		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				628,63
9	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,79560	133,45	106,17
10	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,38680	92,84	221,59
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,79560	95,71	76,15
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku				
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,91200	6,68	106,29
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,79560	133,02	106,55
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,79560	14,93	11,88
Celkem						98 495,61

